

宁县平子镇聚星苑小区项目

水土保持方案报告表

建设单位：庆阳聚星苑房地产开发有限公司

编制单位：庆阳市金美森环境工程有限公司

编制时间：二〇二二年七月





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91621002MA71D39M77

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
信息公示系统
信息公示系统
信息公示系统



名称 庆阳市金美森环境工程有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 付伟英

注册资本 壹佰万元整

成立日期 2020年09月30日

营业期限 2020年09月30日至 2030年09月29日

住所 甘肃省庆阳市西峰区安化东路8号

经营范围 环境影响评价、竣工验收、水土保持论证报告、水土保持方案编制、竣工验收、水土保持监测、水土保持工程规划设计、施工、小流域综合治理项目规划、设计、施工、防洪影响评价报告编制、土地复垦方案编制、园林绿化工程设计、施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

宁县平子镇聚星苑小区项目

发布日期: 2022-08-01

项目类型: 城市建设类-房地产工程

发布类型: 方案公示

建设单位: 庆阳聚星苑房地产开发有限公司

编制单位: 庆阳市金美森环境工程有限公司

监测单位:

地理位置: 甘肃省庆阳市宁县

说明: 根据《中华人民共和国水土保持法》的规定,我单位委托庆阳市金美森环境工程有限公司编制了《宁县平子镇聚星苑小区项目水土保持方案报告表》。现根据水利部办公厅最新下发办水保〔2020〕160号文,要求建设单位通过官方网站或其他便于公众知悉的方式向社会公开拟报批的水土保持方案全文。现将方案报告表予以公示,接受社会监督。如对该项目水土保持方案报告表存在异议请向我单位反馈。

附件: 附件1: 宁县平子镇聚星苑小区.pdf

宁县平子镇聚星苑小区项目水土保持方案报告表

宁县平子镇聚星苑小区项目
水土保持方案报告表责任页
编制人员名单

编制单位：庆阳市金美森环境工程有限公司

批 准：付伟英

付伟英

核 定：付伟英

审 查：周文晶

周文晶

校 核：肖太强

肖太强

项目负责人：付伟英

付伟英

参加编写人员

参加人	职 称	编写内容	签 字
周文晶	工程师	综合说明、项目区概况、水土流失预测、主体工程水土保持分析与评价、防治责任范围	周文晶
肖太强	工程师	水土保持措施、概算投资、水土保持管理	肖太强
徐艳萍	助理 工程师	主体工程水土保持分析与评价、防治责任范围、 制 图	徐艳萍

水土保持方案报告表

送审单位
(个人): 庆阳聚星苑房地产开发有限公司
法定代表人

(组织领导人): 刘小勇

地址: 宁县平子镇平子村

联系人: 张渊

电话: 173****5556

报批时间: 2022年7月

宁县平子镇聚星苑小区项目水土保持方案特性表

项目概况	位 置	宁县平子镇平子村			
	建设内容	项目总用地面积 6626.67m ² ，新建 2 栋住宅楼及室外附属工程。			
	建设性质	新建	总投资（万元）		8000
	土建投资（万元）	6530	占地面积（m ² ）		永久：6626.67m ²
					临时：0.0
	动工时间	2022 年 4 月		完工时间	2023 年 3 月
	土石方（m ³ ）	挖 方	填 方	借 方	余（弃方）
		10971.2	11094.6	123.4	0
	取土（石、砂）场	-			
弃土（石、渣）场	-				
项目区概 况	设计重点防治区情况	黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区		地貌类型	黄土高原沟壑区
	原地貌土壤侵蚀模数（[t/(k m ² a)]）	2000		容许土壤流失量（[t/(km ² a)]）	1000
项目选址（线）水土保持评价		符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的限制性规定			
预测水土流失总量 （ t ）		100.39			
防治责任范围（hm ² ）		0.66			
防治标准等级及目标	防治标准等级	西北黄土高原区水土流失防治一级标准			
	水土流失治理度（%）	≥93	土壤流失控制比		≥1.0
	渣土防护率（%）	≥92	表土保护率（%）		不涉及
	林草植被恢复绿（%）	≥95	林草覆盖率（%）		≥22
水土保持措施	楼房建筑区：排水管网 515.0m、洒水降尘 180.0 m ³ 、临时排水沟 75.0m。院落硬化区：雨水收集口 6 个、透水砖铺设 450.0m ² 、临时沉砂池 1 处、临时排水沟 78.3m、车辆清洗台 1 个。绿化美化区：土地整治 2319.34 m ² 、绿化乔木 59 棵、小叶黄杨绿篱 160.0m、花草种植 2100.0 m ² 、抚育管理 2 年、密目网苫盖 885.5m ² 、编织袋装土拦挡 97.2m。				
水土保持投资估算（万元）	工程措施	11.35		植物措施	1.16
	临时措施	6.75		水土保持补偿费	9.28
	独立费用	建设管理费		0.39	
		水土保持监理费		0.0	
		设计费		1.40	
	总投资	22.60			
编制单位	庆阳市金美森环境工程有限公司			建设单位	庆阳聚星苑房地产开发有限公司
法人代表及电话	付伟英 177****3313			法人代表及电话	刘小勇 133****6939
地址	庆阳市西峰区安化东路 8 号			地址	庆阳市宁县平子镇平子村四组 278 号
邮编	745000			邮编	745208
联系人及电话	付伟英 177****3313			联系人及电话	张渊 173****5556
统一社会信用代码	91621002MA71D39M77			统一社会信用代码	91621002MA72WW3D9E
传真	-			传真	-

目 录

1 综合说明	1
1.1 项目简况.....	1
1.2 项目前期工作及方案编制情况.....	1
1.3 自然简况.....	2
1.4 编制依据.....	2
1.5 设计水平年及设计深度.....	3
1.6 水土流失防治责任范围.....	4
1.7 水土流失防治目标.....	4
1.8 项目水土保持评价结论.....	4
1.9 水土流失预测结果.....	5
1.10 水土保持措施布设成果.....	5
1.11 水土保持监测方案.....	6
1.12 水土保持投资及效益分析成果.....	6
1.13 结论	7
2 项目概况	8
2.1 项目组成及总平面布置.....	8
2.2 施工组织.....	9
2.3 工程占地.....	11
2.4 土石方平衡.....	12
2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建.....	13
2.6 施工进度.....	13
2.7 自然概况.....	14
3 项目水土保持评价	17
3.1 主体工程选址水土保持制约因素评价.....	17
3.2 建设方案与布局水土保持分析评价.....	18
3.3 主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价.....	20
3.4 纳入水土保持方案中的主体工程设计措施.....	22
3.5 结论性意见.....	22
4 水土流失预测	24
4.1 水土流失的影响因素分析.....	24
4.1.1 影响因素分析.....	24
4.2 水土流失预测内容和方法.....	24
4.3 弃土、弃渣量预测.....	25
4.4 土壤流失量预测.....	26
4.5 可能造成的水土流失危害预测.....	28
4.6 预测结果及综合分析.....	29
5 水土保持措施	31
5.1 防治区划分.....	31
5.2 防治目标.....	32
5.3 水土保持措施总体布局.....	33
5.4 水土流失治理措施.....	35
5.5 水土保持措施进度安排.....	48
6 水土保持监测及监理.....	49
7 水土保持投资概算及效益分析.....	50
7.1 投资概算.....	50
7.2 效益分析.....	62
8 水土保持管理	66
8.1 组织管理.....	66

8.2 后续设计.....67

8.3 水土保持工程监测.....68

8.4 水土保持工程监理.....68

8.5 水土保持施工要求.....68

8.6 水土保持竣工验收.....69

附 表：

- 1、单价计算表1-5

附件：

- 1、宁县发展和改革局 甘肃省投资项目备案表（庆阳市宁县发改局投资股备【2021】101号）
- 2、宁县自然资源局不动产证书 甘（2021）宁县不动产权第0002631号

附 图：

- 1、工程地理位置图；
- 2、项目区水系图；
- 3、项目区土壤侵蚀图；
- 4、主体工程总体平面布置图；
- 5、项目区防治责任范围图；
- 6、项目区水土保持防治分区及水土保持措施总体布局图；
- 7、绿化树木栽植典型设计图；
- 8、种草及绿篱典型设计图；
- 9、编制土袋挡护典型设计图；
- 10、临时蓄排工程设计图。



1#楼现状图



2#楼现状图



施工道路



施工辅助

1 综合说明

1.1 项目简况

1.1.1 项目基本情况

项目名称：宁县平子镇聚星苑小区项目；

建设单位：庆阳聚星苑房地产开发有限公司；

建设地点：宁县平子镇平子村

建设性质：新建；

项目组成：项目总用地面积 6626.67m^2 ，总建筑面积 23874.87m^2 ，项目由 2 栋住宅幢及相关附属建筑组成。

建设规模：新建 2 幢框剪结构住宅楼，其中 1#楼 15 层、2#楼 12 层；室外附属工程：大门、混凝土道路、透水砖铺装、绿化、亮化、监控及综合管网等，经现场踏勘，本项目地下车库由于其他原因未建设。

占地面积：项目总用地面积 6626.67m^2 ，总建筑面积 23874.87m^2 。

项目建设区中心地理坐标：东经 $108^{\circ}10'34.6''$ ，北纬 $35^{\circ}26'58.9''$ ，该项目用地原地貌为露天型旧交易市场，项目范围内无居民用房等相关建筑物，不存在拆迁安置问题。

工程总投资：项目总投资 8000.0 万元。其中，土建投资 6530.0 万元。资金来源：企业自筹解决；

建设工期：工程已经于2022年4月初开工建设，计划2023年3月底竣工，总工期为12个月；

土石方量：本项目建设概算总挖方 10971.2m^3 ，填方 11094.6m^3 ，借方 123.4m^3 ，无余（弃）方。

1.2 项目前期工作及方案编制情况

（1）项目前期报批手续办理进展

2021 年 5 月 6 日，项目经宁县发展和改革局审核后，取得甘肃省投资项目备案表（庆阳市宁县发改局投资股备【2021】101 号）

（2）主体工程进展情况

经过现场踏勘，项目已动工建设，目前 1#楼主体已建成，2#楼正在建设中。

（3）水保方案编制委托

水保方案编制阶段：本项目水保方案为补编补报水保方案。

2022年7月5日，受庆阳聚星苑房地产开发有限公司委托，庆阳市金美森环境工程有限公司承担了该项目水保方案的编制工作，接受委托后，庆阳市金美森环境工程有限公司立即派出有关技术人员赴现场进行调查和踏勘，进行了资料收集，2022年7月25日编制完成了《宁县平子镇聚星苑小区项目水土保持方案报告表》。

1.3 自然简况

宁县地处大陆内部，属暖温带大陆性季风气候，四季分明，光照充足。年平均气温8.7℃，历年极端最高气温36.5℃，历年极端最低气温-25.4℃，历年最热月（7月）平均温度为22℃，最冷月（元月）平均气温为-5.8℃。多年平均降水量565.9mm，春季半干旱地。冻土深度一般在80cm以下，最大冻土深度为86cm。

项目区地处宁县平子镇平子村，建设场地临近乡镇街道，交通便利，基础设施较为完善，适合项目建设。该项目占地面积6626.67m²，用地南北宽97.81m，东西长71.03m，用地符合宁县平子镇土地利用总体规划。场地南面临近平子街道、其余三侧为居民区及空地，建设场地平坦。

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》，本项目区属于黄河多沙粗沙国家级重点治理区；按照《甘肃省人民政府关于划定省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》，本项目区属于泾河流域省级水土流失重点治理区。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属西北黄土高原区，水土流失容许值为1000t/km²a。

项目区不涉及饮用水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等。

1.4 编制依据

1.4.1 法律法规

- （1）《中华人民共和国水土保持法》，全国人大常委会，2010.12.25；
- （2）《甘肃省水土保持条例》甘肃省人大常委会，2012.8.10；
- （3）《中华人民共和国水法》，全国人大常委会，2016.7.2；
- （4）《中华人民共和国环境保护法》，全国人大常委会，2014.4.24；
- （5）《中华人民共和国土地管理法》，全国人大常委会，2019.8.26；
- （6）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令 682 号，2017.6.21；

(7) 《中华人民共和国防洪法》全国人大常委会，2015.4.24。

1.4.2 技术标准

- (1) 《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）；
- (2) 《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）；
- (3) 《水土保持综合治理 效益计算方法》（GB/T15774-2008）；
- (4) 《开发建设项目水土保持设施验收规范》（GB/T22490-2008）；
- (5) 《造林技术规程》（GB / T15776-2016）；
- (6) 《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；
- (7) 《水土保持林工程设计规范》（GB/T 51097-2015）；
- (8) 《水利水电工程制图标准 水土保持制图》（SL73.6-2015）；
- (9) 《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）；
- (10) 《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保〔2015〕139号）；
- (11) 《水土保持工程概算定额》（水利部水总〔2003〕67号）；
- (12) 《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；
- (13) 《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007）。

1.4.3 技术资料

- (1) 《全国水土保持规划（2015-2030年）》；
- (2) 《甘肃省水土保持规划（2016-2030）》；
- (3) 《甘肃省中小流域设计暴雨洪水图集》；
- (4) 《宁县年鉴》（2020年）；
- (5) 《宁县平子镇聚星苑小区项目可行性研究报告》。

1.5 设计水平年及设计深度

工程于2022年4月初开工建设，计划于2023年3月底竣工。本工程属建设类项目，按照水土保持“三同时”（即：水土保持方案确定的各项水土流失防治措施均应与主体工程同时设计、同时施工、同进投产使用）的要求和“建设类项目设计水平年应为主体工程完工后的当年或后一年”的规定，届时方案确定的各项防治措施布设到位，能稳定存续、发挥或初步发挥水土保持功能（工程措施均已布设完备，植物措施保证了成活率和保存率、灌溉等抚育管理责任落实），达到方案确定的防

治目标，满足水土保持工程验收的要求。结合本项目的实际情况，故本方案设计水平年确定为 2023 年，设计深度为初步设计阶段。

1.6 水土流失防治责任范围

宁县平子镇聚星苑小区项目总扰动面积为 6626.67m²。

1.7 水土流失防治目标

1.7.1 执行标准等级

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》，本项目区属于黄河多沙粗沙国家级重点治理区；按照《甘肃省人民政府关于划定省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》，本项目区属于泾河流域省级水土流失重点治理区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T 50434-2018)，本方案水土流失防治标准执行西北黄土高原区水土流失防治一级标准。

1.7.2 防治目标

设计水平年的六项防治目标为：水土流失治理度 $\geq 93\%$ ，土壤流失控制比 ≥ 1.0 ，渣土防护率 $\geq 92\%$ ，表土保护率不涉及（项目用地原地貌为露天型旧交易市场，由于市场的交易属性，人为扰动因素较大，原地貌无可剥离的有机质层表土，因此，本项目不进行表土剥离与回覆），林草植被恢复率 $\geq 95\%$ ，林草覆盖率 $\geq 22\%$ 。

1.8 项目水土保持评价结论

1.8.1 主体工程选址（线）评价

由主体工程初步设计可知，建设单位总体上具有较强的生态环境保护意识，主体工程设计中，除了考虑工程本身安全运行以外，也考虑了工程建设与生态环境保护及水土保持之间的关系，主要体现在以下几个方面：

（1）从工程选址、施工组织设计、施工及工程管理等分析，符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的限制性规定。

（2）项目区属于国家级水土流失重点治理区，无法避让，水土流失防治标准按西北黄土高原区水土流失防治一级标准执行，并提高防治指标、强化防治措施、优化措施配置。

（3）主体工程初步设计中虽然设计了一系列具有水土保持功能的措施，但也存在一些问题，忽略了施工过程中必要的临时防护措施，不能形成有效的水土保持综合防治体系。因此，本方案在对主体工程水土保持分析评价的基础上，进一步补充

和完善了水土流失防治措施，使本方案水土保持措施形成一个完整、周密、科学的防治体系。

总之，该项目在建设过程中虽然产生水土流失，但通过采取防护措施，可以防治水土流失，不会产生比较大的危害。本方案认为主体设计在选址、保证工程的顺利建设和安全运行，节约投资等方面，充分考虑了水土保持、环境影响各项要求，没有制约工程建设的限制因素，是科学合理可行的。

1.9 水土流失预测结果

(1) 本项目在建设过程中扰动原地貌、损坏或占压土地、植被的面积为 6626.67m^2 ，全部为商业用地。

(2) 建设期损坏水土保持设施和具有水土保持功能设施的面积为 6626.67m^2 ，自然恢复期水土流失面积为 2319.34m^2 。

(3) 本项目总开挖方量 10971.2m^3 ，回填方量 11094.6m^3 ，借方 123.4m^3 ，无余(弃)方。

(4) 可能造成水土流失量总量为 100.39t ，其中建设期水土流失量 79.52t ，自然恢复期 20.87t 。

(5) 可能产生的工程建设新增水土流失量 69.24t ，其中建设期新增水土流失量为 53.01t ，自然恢复期 16.23t 。

(6) 水土流失危害有：损坏和影响土地资源、影响区域生态环境、影响城市防洪、影响周边环境。

(7) 施工期，各种防护措施没有完成之前，难免会造成施工占地范围内水土流失的发生。因此，施工期为水土流失预测重点时段。

1.10 水土保持措施布设成果

1.10.1 防治分区的划分

按照《生产建设项目水土保持技术标准》要求，结合项目建设施工和运行特点，将项目建设区域划分为楼房建筑区、院落硬化区和绿化美化区三个防治分区。

1.10.2 措施总体布局

本方案水土保持措施的布设本着“统筹全局、分区防治、合理安排、突出重点”和“因地制宜、生态优先”的原则，使工程、植物、临时拦挡等水保措施与施工管理有机结合，永久性、临时性、过渡性水保措施适时布设，乔木、灌木、草本植物适

地立体配置，最终形成一个较为完整的、布设科学合理的水土保持综合防治体系。

1、楼房建筑区

(1) 工程措施：排水管网 515.0m；

(2) 临时措施：洒水降尘 180.0 m³、临时排水沟 75.0m。。

2、院落硬化区

(1) 工程措施：雨水收集口 6 个、透水砖铺设 450.0m²；

(2) 临时措施：临时沉砂池 1 处、临时排水沟 78.3m、车辆清洗台 1 个。

3、绿化美化区

(1) 工程措施：土地整治 2319.34 m²；

(2) 植物措施：绿化乔木 59 棵、小叶黄杨绿篱 160.0m、花草种植 2100.0 m²、抚育管理 2 年；

(3) 临时措施：密目网苫盖 885.5m²、编织袋装土拦挡 97.2m。

1.11 水土保持监测方案

按照《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160 号）规定，本项目不做水土保持监测工作。

1.12 水土保持投资及效益分析成果

1.12.1 水土保持投资概算

本方案水土保持概算总投资为 22.60 万元（新增投资 11.80 万元），其中工程措施投资 11.35 万元、植物措施投资 1.16 万元、临时工程投资 6.75 万元、独立费用 1.79 万元、基本预备费 0.62 万元。

1.12.2 水土保持效益分析结论

(1) 本方案实施后的 6 项指标为：土壤流失总治理度 98.7%，土壤流失控制比 1.25，渣土防护率 98.2%，表土保护率不涉及，林草植被恢复率 98.6%，林草覆盖率 35.0%，各项水土保持措施达到了西北黄土高原区水土流失防治一级标准，治理效果显著。

(2) 水土保持效益分析

本方案实施后水土流失防治责任范围内的新增水土流失能够得到有效控制，结合主体工程已设计的植被恢复措施，共布设生物措施面积（主要包括空地植树、种草及行道树栽植）2319.34m²，林草覆盖率达到 35.0%，使项目区的生态环境得到明

显的恢复和改善。

1.13 结论

1) 通过对本工程建设内容、施工工艺及易产生水土流失的施工环节分析，本方案认为宁县平子镇聚星苑小区项目合理可行；

2) 主体工程选址符合城乡规划、地方政府用地规划和经济发展规划、符合水土保持要求，同意主体工程推荐方案为项目建设方案；

3) 方案实施后设计水平年的六项防治指标六项达到目标值。从水土保持生态效益和社会经济效益分析可见，本方案实施后，项目建设造成的新增水土流失能够得到有效的控制，把危害降到最低限度，生态环境可得到恢复和改善。

2 项目概况

2.1 项目组成及总平面布置

2.1.1 项目组成

项目总用地面积 6626.67m²，总建筑面积 23874.87m²，项目由 2 栋住宅幢及相关附属建筑组成。主要经济技术指标详见表 2-1，建设规模明细详见表 2-2。

表2-1 主要经济指标一览表

序号	名称	单位	数量	备注
1	规划总用地面积	m ²	6626.67	
2	规划总建筑面积	m ²	23874.87	
3	建筑基底面积	m ²	1371.40	
4	建筑密度	%	18.41	
5	容积率		2.88	
6	绿地率	%	35.0	
7	车位数	个	158	
8	总户数	户	158	

表2-2 项目建设规模明细表

序号	项 目	备 注
1	1#住宅楼	地上十五层剪力墙结构，建筑面积 9138.26 m ² ；
	2#住宅楼	地上十二层剪力墙结构，建筑面积 11276.54 m ² ；
	便利店	建筑面积 60.56m ² ；
	物业用房	建筑面积 60.56m ² ；
	社区活动用房	建筑面积 60.56m ² ；
2	附属工程	大门、混凝土道路、透水砖铺装、绿化、监控综合管网

2.1.2 总平面布置

根据场地所处的地理位置、周围环境及规划局的要求，新建 1#、2#、3#、4#、5#住宅楼，其中 1#、2#住宅楼位于场地南侧， 3#住宅楼位于场地中间偏西侧，4#、5#住宅楼位于场地北侧。小区出入口位于建设用地东侧，地库出入口位于建设用地南侧，与宁州五路相接。

(1) 住宅布局

因地制宜，规划新建 1#与 2#住宅楼“一”字型位于场地南侧，4#与 5#住宅楼“一”型位于场地北侧，3#住宅楼位于场地中间偏西侧，以小区人行道路和公共绿化步行带划分形成数个住宅组团，每个住宅组团以住宅周边布局围合组团中心花园为基本的组织原则，通过建筑 and 环境的错落布置，营造出既彼此独立又相互联系，统一而

又富有变化的整体。并形成围而不合、形态各异的空间格局，营造灵活有序、层次丰富的整体空间形态。

住宅类型为高层，形成高尺度的小区内部环境景观。根据基地内景观价值的区别，相应布置大小不同的户型。建筑立面设计采用现代中式的建筑风格，外立面材质以外墙涂料为主，底部勒脚采用文化石贴面；建筑色彩以暖色为主色调，灰色、赭石色作为装饰线条。营造出优美、大气的小区整体形象。

2.1.3 道路交通系统

依据功能布置、用地特点、消防要求及业主需求，充分考虑利用周边市政道路布置交通。小区出入口位于建设用地东侧，地库出入口位于建设用地南侧，与宁州五路相接。人流由用地东侧，车流由南侧进入场地。场地内道路宽度为 4.00m，转弯半径为 9.00m，交通方便快捷，满足消防及交通需求。

2.1.4 绿化系统

1.社区绿化空间体系

依据建设场地整体布局沿建设场地四周及建筑周边布置带状绿化，根据宁县自有的地理位置气候特征，绿化种植选用适宜当地生长的植物，达到美化环境的目的，为村民提供一个舒适、优美的生活环境。

2.绿化种植配置

在绿化种植配置上，根据北方的气候特点，其关键在于营造绿色景观效果，进而体现品种多样化、色彩协调并具有层次感，在总体上应做到以下三点：1、树木多，草坪少，且应增加常绿树种的比重；2、高大植物和低矮灌木的有机结合，形成丰富的竖向层次；3、以植物的自然状态为主，辅以局部的人工雕琢，形成精致和粗犷的对比。

2.1.5 基础设施规划

配电房、煤气调压站、垃圾站等配套公共基础设施，规划配置按环卫设计、给排水设计、暖通设计、电气设计、结构设计等专项设计要求，及其配置需要，确定其布局位置及占地面积。

2.2 施工组织

2.2.1 施工工艺

（1）建筑物工程施工

项目区开挖与填筑依据主体工程地形、建设内容及时序，计算项目具体挖填土

方量，按照就近调配的原则进行开挖、回填，以减少土方运距，尽量避免土方二次运输；土方运输过程中对运输车辆加盖，防止土方沿路撒落，造成水土流失。

基础土方开挖、运移及填筑基础施工方式：土方开挖、运移及填筑施工按照“绘制基础土方开挖方案”→“测量放线”→“机械开挖”→“降排水措施”→“人工修整”→“验槽”的顺序进行。

基础开挖前，先进行测量定位，抄平放线，定出开挖宽度，按放线分块(段) 分层挖土。根据土质和水文情况，采取在两侧直立开挖，以保证施工操作安全。基础开挖时上部设排水措施，防止地面水流入坑内冲刷边坡，造成塌方和破坏基土。当开挖基础的土体不稳定，或受到周围项目区限制则需要较陡的边坡或直立开挖而土质较差时，应采用临时性支撑加固，基坑每边的宽度应为基础宽加 10~15cm 用于设置支撑，挡土板要贴紧土面，并用小木桩或横撑木顶住挡板。开挖宽度较大的建筑物基础，当在局部地段无法放坡时，或下部土方受到基础尺寸限制不能放较大坡陡时，应在下部坡脚采取加固措施，如采用短桩与横隔板支撑或砌砖、毛石或用纺织袋、草袋装土堆砌临时拦挡保护坡脚；当开挖深基础时，则需采取半永久性且安全、可靠的支护措施。挖土应自上而下水平分段分层进行边挖边检查坑底长度和宽度，不够时及时修整，至设计标高，再统一进行一次修坡清底，检查坑底长度和宽度及标高，要求坑底凹凸不超过 15cm。雨季施工时基础应间隔开挖，挖好一个浇筑一个垫层，并在基础周围以土堤或挖排水沟，以防止地面雨水流入基坑，同时应经常检查边坡和支护情况，以防止坑壁受水浸泡造成塌方。基础挖完后应进行验槽，作好记录，如发现地基土地质与地质勘探报告、设计要求不符合时，应与有关人员研究及时处理。

(2) 道路及停车工程施工

建设过程中项目区内道路、管线统一规划，综合布设。各种工程管线尽量同步建设，避免重复开挖、敷设，以减少地表扰动，加快施工进度。道路建设施工工序：压实土路基—填筑风化岩土—填筑中粗砂—水泥稳定石屑基层—砌筑路缘石—浇筑面层。工程区内道路路基填筑时，选择挖土回填，分层填筑、分层压实，下层应选用水稳性好的砂砾填筑。在工程建设初期，道路路基需暴露一段时间，路基排水也要待项目区平整后进行，因此道路的路面可能会有水土流失产生。工程区内管线主要包括给水、雨水、污水、电力、通信五个专业的管线。管线开挖的土方临时堆于管沟两侧，待管道敷设结束后，回填使用。管沟开挖一般采用分段施工，上一段

建设结束才开展下一段的施工，以减少开挖量。管道埋设均沿道路铺设，管线采用大开挖施工，开挖后及时回填。管道敷设后，回填土方，少量余土平铺拍实于管线占地区。管线工程采用直埋敷设法施工，采用明挖法开挖管沟，管沟断面采用梯形，沟底宽度根据管径、土质、施工方法等确定。

（3）绿化工程施工

绿化工程施工工序为：清理项目区—项目区平整—放线定点—挖种植穴—施基肥—苗木栽植—苗木浇灌—施工后清理—苗木养护。应做好植物病虫害的预测预报工作，发现病虫害及时防治，尽量将病虫害造成的损失降到最低程度。发现苗木死亡要及时进行补种。

（4）排水系统

1) 住宅生活排水系统采用污、废分流制排水系统形式，采用伸顶通气管单立管排水系统。污水管网与乡镇污水管网相接。

2) 雨水排水系统：场地内雨水通过雨水收集口收集，由排水管网统一排至乡镇市政雨水管网。

2.2.2 开挖临时堆土处置措施

查阅主体设计资料中的要求，对临时堆土的处置措施主要有：施工过程中产生的开挖基础土先在基坑四周进行集中临时堆放，用于基础回填和院坪抬高回填，对于不能及时回填的，如超过一周，采取覆盖防尘布或防尘网、定期喷水压尘、喷洒抑尘剂等防尘措施，防止风蚀起尘及降雨引起的水蚀迁移。在进入汛期前，临时堆置土石渣及时清运处理结束，汛期停止土方开挖、运输等工作，主要进行建筑作业，对于因工期等原因局部不能避开的要采取严格的防汛措施，明确施工单位防汛责任，切实落实防汛措施，保障主体工程安全，防止水土流失危害的发生。

2.2.3 施工期建筑材料存放措施

本项目施工中主要建筑物，院落硬化等大面积用混凝土工程主要以商砼为主；局部工程施工过程中使用的水泥、石灰、沙石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，采取密闭存储；采用防尘网苫盖等一系列措施减少扬尘及雨季水蚀。

2.3 工程占地

根据《宁县平子镇聚星苑小区项目初步设计报告》、总平面布置图及相关指标表，并通过本水保方案编组技术人员现场调查、踏勘并与建设方沟通确认，确定该

项目总扰动面积6626.67m²。该项目用地原地貌为旧交易市场，项目用地性质为商业用地。项目占地情况见表2-3。

表2-3 项目征占地统计表

区域类别	占地性质	用地性质	占地数量 (m ²)
楼房建筑区	永久	商业用地	1371.40
院落硬化区	永久		2935.93
绿化美化区	永久		2319.34
合计			6626.67

2.4 土石方平衡

1、项目土石方挖填：

项目用地原地貌为露天型旧交易市场，原地貌无可剥离的有机质层表土，因此，本项目不进行表土剥离与回覆；由于其他原因本项目设计的地下车库不再建设，因此，本项目未进行大开挖作业，土方量主要为2幢楼的主体基础开挖土方。依据主体设计，主体工程建设过程中基础开挖土方10971.2m³，回填11094.6m³，借方123.4m³（石灰），调出2066.2m³，调入2066.2m³，无弃方产生，临时调方土前期堆放在场地空地，用密目网苫盖，并用编织袋装土拦挡，后期通过楼体基础回填、场地绿化回覆、院落道路填高等措施全部平衡利用。

主体工程建设中的土石方量平衡详见表2-4。

表 2-4 项目建设土石方平衡表 单位：m³

编号	单项工程	挖方	填方	调出方	调入方	借方		弃方	
				数量	数量	数量	来源	数量	去向
楼房建筑区	商业楼	10971.2	9028.4	2066.2		123.4	外购	0.0	
院落硬化区	院坪	0.0	1502.3		1502.3	0.0	-	0.0	
绿化美化区	绿化	0.0	563.9		563.9	0.0	-	0.0	
合计	合计	10971.2	11094.6	2066.2	2066.2	123.4	外购	0.0	

注：①表中数字均为自然方；②回填已计入土石方平衡，新增建筑垃圾等弃渣在4.3章节弃渣量预测中计算；③各行按“挖方+调入方+外借方=填方+调出方+余（弃）方”进行校核；④余

(弃)方=挖方+外借方+调入方-填方-调出方。

2、表土剥离与回覆

项目建设前，为恢复和保持绿化区土壤肥力，提高林草成活率和确保林草正常生长，按水土保持技术规范要求，在项目开工建设前，对表层有机土进行剥离并单独堆存，在项目后期绿化时进行表土回覆。

项目用地原地貌为露天型旧交易市场，由于市场的交易属性，人为扰动因素较大，原地貌无可剥离的有机质层表土，因此，本项目不进行表土剥离与回覆。

土石方流向框图见图 2-5。

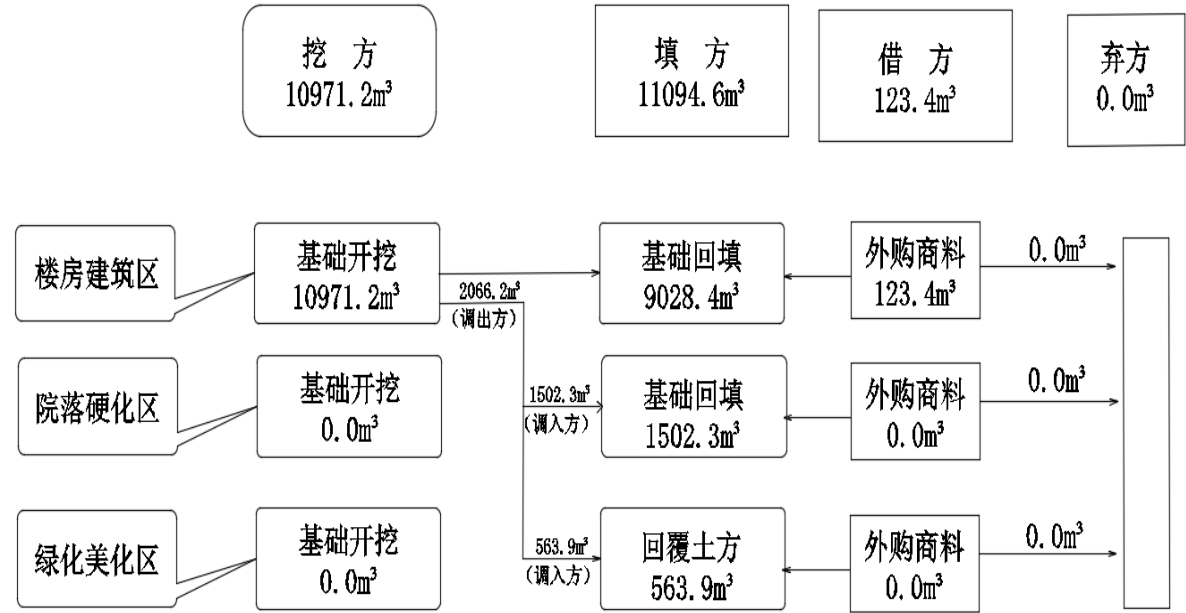


图 2-5 土石方流向框图

2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

该项目用地原地貌为露天型旧交易市场，项目范围内无居民用房等相关建筑物，不存在拆迁安置问题。

2.6 施工进度

宁县平子镇聚星苑小区项目于 2022 年 4 月初开工建设，计划 2023 年 3 月底竣工，总工期 12 个月。施工进度详见图 2-7。

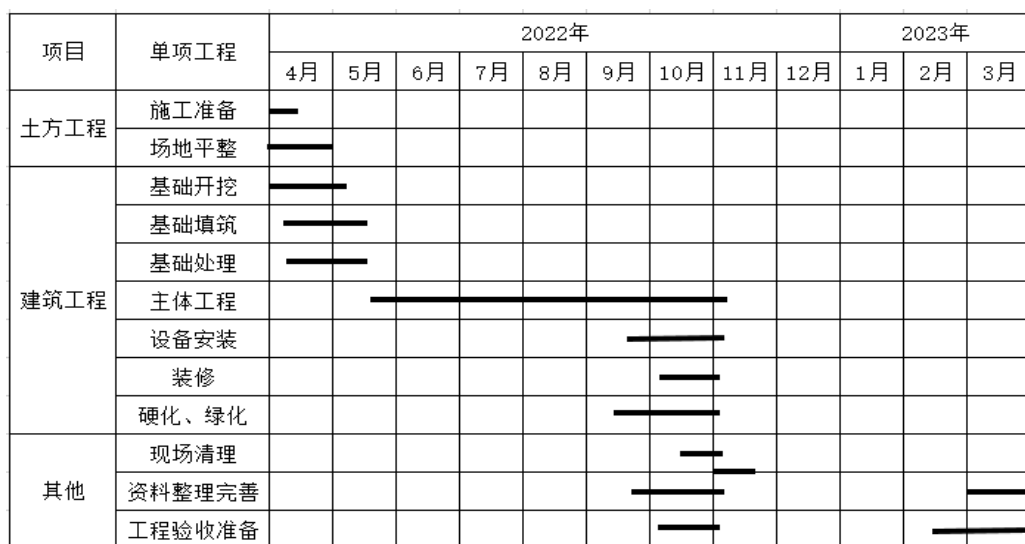


图 2-7 主体工程施工进度横道图

2.7 自然概况

宁县位于甘肃省东部，庆阳市东南部。海拔在 820 到 1640 米之间，相对高差 800m，东依子午岭，南接陕西，北靠宁县和西峰区，西临泾、蒲二河，距黄陵 160 公里，西安 250 公里，兰州 510 公里。扼甘、陕、宁三省之要冲，是三省结合部人流、物流、信息流、资金流的窗口，且有显著的区位优势。全县土地总面积 2653.72km²，农业用地 798.63km²。

2.7.1 地质

1、本工程场地地貌单元属黄土塬侵蚀地貌，场地开阔、平坦，周边无地表流水，勘察深度范围内土层较简单，自上而下依次为：

①耕土（Q4ml）：分布于整个拟建场地。耕土：黄褐色，不均匀，松散，稍湿，包含杂草、植物根系，少量塑料袋等生活垃圾，主要以黄土状粉土为主。层顶高程 1306.07~1306.55m，层厚 0.90~1.40m，层底埋深 0.90~1.40m，层底高程 1304.74~1305.58m。

②马兰黄土（Q3eol）：分布于整个拟建场地。马兰黄土：黄褐色，稍密，稍湿，土质较均匀，包含植物、杂草根系，层顶分布，孔隙发育强烈，具针孔、虫孔、大孔结构，孔洞多为白色菌丝钙化物填充，无光泽反应，干强度低，韧性低，摇振反应中等。层顶高程 1304.74~1305.58m，层厚 10.80~11.90m，层底埋深 12.10~12.80m，层底高程 1293.37~1294.26m。

2.7.2 地貌

宁县地处陕甘宁盆地南部，位于董志塬南部。黄土层厚度达 150-200 米，具有垂直节理。由于长期受河流切割，形成高原深谷，沟壑纵横的地貌景观。区域大地构造单元上位于陕甘宁盆地南侧，第四纪以来构造活动较弱，以区域性上升为主，主要受北东东、北东，南北、东西向构造的控制，形成一系列倾斜向斜及背斜构造。

项目区地处宁县平子镇平子村，建设场地临近乡镇街道，交通便利，基础设施较为完善，适合项目建设。该项目占地面积 6626.67m²，用地南北宽 97.81m，东西长 71.03m，用地符合宁县平子镇土地利用总体规划。场地南面临近平子街道、其余三侧为居民区及空地，建设场地平坦。

2.7.3 气象

宁县地处中纬度大陆腹地，属温带大陆性气候。据宁县气象局资料，年平均气温为 8.7℃，最冷月为一月份，月平均气温为-5.8℃，最热月为七月份，月平均气温为 21.9℃，极端最高气温为 36.5℃，极端最低气温为-25.4℃；最大冻土深度为 86cm。

宁县地处中纬度大陆腹地，属温带大陆性气候。据宁县气象局资料，年平均气温为 8.7℃，最冷月为一月份，月平均气温为-5.8℃，最热月为七月份，月平均气温为 21.9℃，极端最高气温为 36.5℃，极端最低气温为-25.4℃；最大冻土深度为 86cm。

年降水量约 572.1mm，降水主要集中在七、八、九三个月（分别为 106.9mm、104.9mm、106.4mm），且以暴雨形式出现，汛期降水占全年降水量的 55%左右，降水强度大，24 小时降水量 50~99.9mm，6 小时最大降水量 49.9mm。年蒸发量达 1435.8mm；年平均日照时数 2449 小时，平均风速 2.3m/s，最大风速 20m/s，全年主导风向为东南风及西北风；无霜期 168.2 天。

2.7.4 土壤

宁县土壤是在黄土母质和次生黄土母质上发育形成的，土壤主要有 4 个土类：

①黑垆土：主要农业土壤，主要分布在塬面，土层厚约 250cm，其上松下粘，耕性良好，适耕期长，易渗水保墒。有机质含量一般在 0.8—1.2%，全氮含量 0.07—0.09%，钾的含量比较丰富，呈石灰性反应，PH 值在 7.5—8.5 之间，保水保肥性能良好，是比较好的农业土壤。

②黄绵土：主要分布在梁峁及坡地上，是在长期耕作条件下形成的一种幼年土壤，其节理性较差，剖面发育不完全，但砂粘适中，土质疏松，耕性良好，有机质含量在 0.8%左右，全氮含量在 0.066%左右，其肥力的高低与水土流失的强度成正相

关，在地形比较平缓；植被较好和拦泥、蓄水比较高的地块，成土作用增强，土壤结构得到改善，肥力不断提高；在坡度较陡，植被较差，侵蚀较强的地块，成土作用弱、耕性较差、肥力降低。

③红粘土：主要分布在主沟道中下游及支沟下游沟床两侧的坡脚处，坡度较陡，一般大于 35°，呈泻溜侵蚀，其土质粘重，土体坚实，块状结构，通透性差，肥力低下。

④淤积土：主要分布在沟谷、沟台地、沟坝地上。大部分肥力较高，水分条件好，是质量较好的土壤之一，适宜造林种草。

2.7.5 植被

宁县属暖温带森林草原植被类型。天然草原植被以铁杆蒿群落和白羊草加本氏针茅群落为主。人工栽培的乔木树种主要有刺槐、侧柏、油松、杨树、柳树等；灌木树种主要有沙棘、紫穗槐、狼牙刺等；果树和经济树种林主要有苹果、杏、梨、葡萄、枣树等。人工牧草以紫花苜蓿为主，天然草以冰草、白羊草、马牙草、艾蒿、稗草、穿叶眼子菜等天然草群落为主。全县经过多年的水土保持综合治理，现已形成以刺槐、侧柏、油松、山杏、沙棘等为主的人工植物群落。林草覆盖率为 18.4%。

2.7.6 防治类型区划分

依据水利部办公厅办水保〔2013〕188号《关于印发全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》，项目区属黄河多沙粗沙国家级重点治理区；按照《甘肃省人民政府关于划定省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（甘政发〔2016〕59号），本项目区属于泾河流域省级水土流失重点治理区。项目区不涉及饮用水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等。

3 项目水土保持评价

3.1 主体工程选址水土保持制约因素评价

依据《中华人民共和国水土保持法》（2010 年 12 月 25 日）、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）及《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水保〔2007〕184 号），逐条对照分析本工程制约性因素，见表 3-1、表 3-2。

表 3-1 主体工程制约性因素与水保法对照分析表

序号	《中华人民共和国水土保持法》法条原文	本工程实际情况	符合情况
1	第十七条：禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。	本项目建设区不属于县级以上地方人民政府划定的崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区内。	符合
2	第十八条：水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。	本工程建设区不属于水土流失严重、生态脆弱的地区。	符合
3	第二十四条：生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。	本项目属于国家级水土流失重点治理区，无法避让，水土流失防治标准按西北黄土高原区水土流失防治一级标准执行，并提高措施标准。	基本符合
4	第二十五条：在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。	本工程建设单位已委托单位编制水土保持方案，并将按要求上报庆阳市宁县水土保持管理局审批。	符合
5	第三十二条：在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能的，应当缴纳水土保持补偿费，专项用于水土流失预防和治理。	已按省发展和改革委员会、省财政厅、省水利厅印发《关于水土保持补偿收费标准的通知》（甘发改收费〔2017〕590号）确定的收费标准，本项目补偿费共计9277.34元。	符合

表3-2 主体工程满足规范的评价

序号	《生产建设项目水土保持技术标准》 (GB50433-2018) 规定	本工程实施情况	是否满足 条文要求
1	选址(线)应避让水土流失重点预防区和重点治理区。	本项目属于国家级水土流失重点治理区,无法避让,水土流失防治标准按西北黄土高原区水土流失防治一级标准执行,并提高措施标准。	满足
2	选址(线)应避让河流两岸、湖泊和水库周边的植物林带。	本工程不涉及所属区域的植物林带。	满足
3	选址(线)应避让全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。	项目建设区域内无水土保持监测站点及国家确定的水土保持定位观测站。	满足

经分析,本工程符合《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433—2018)和水利部《关于严格生产建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》要求,符合约束性规定的要求。

3.2 建设方案与布局水土保持分析评价

3.2.1 建设方案评价

本项目地处黄土高原沟壑区,项目建设区域不涉及不良地质病害区、严重水土流失和生态恶化区的地段,工程选址、总体布局及施工组织可行,基本符合水土保持法、有关技术规范和规范性文件的条文规定。本项目排水采取“雨污分流”的排水方式,不会产生内涝,排水及水处理方式符合水土保持及环境保护要求。

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》,本项目区属于国家级水土流失重点治理区,无法避让,但本工程为点状的建设类工程,工程建设严格控制在征地范围内,工程占地面积小、土石方挖填平衡,无取土量,且建设工程单一,易于控制。本工程建设方案中设计的建筑工程、道路工程等工程都能够严格的在征地范围内施工,通过拦挡、苫盖及地表恢复措施,水土流失能够得到有效控制,工程建设方案可行、布局合理。

主体工程在雨水集蓄利用设计方面,布设了透水砖铺设、绿地、排水等措施,使场地内的径流能够集蓄利用,雨水经过蓄渗、过滤后排入市政雨水管网,减少了雨水的排放量,提高了雨水回收利用率。

3.2.2 工程占地评价

主体工程设计总占地共计 0.66hm^2 ,全部为商业用地,属永久性占地。

本工程选址的总体思路是符合宁县城乡总体规划,项目建设严格控制在征占地范围内施工,充分利用了项目建设区土地,能够在较短时间内恢复地表,尽可能减少对土地利用总体规划的影响,实现节约集约用地。材料堆放地、施工驻地布设在

建设区域内，减少了对土地的临时占用，提高土地综合利用率。

工程合理安排施工工序和施工时间，大量压缩临时占地面积，减少了对地表土壤的扰动；同时，本工程临时占地主要施工营地、材料堆放地等用地，临时占地时间较短，可以较快恢复原土地利用类型。

经分析，本项目主体工程占地较好地节约了土地，建设用地符合水土保持、生态保护的要求。从水土保持角度分析，工程占地符合有关要求。

3.2.3 土石方平衡评价

根据土石方平衡分析，本项目总开挖方量 10971.2m^3 ，回填方量 11094.6m^3 。借方 123.4m^3 ，无余（弃）方，土石方挖填平衡。

本项目地处宁县平子镇平子村，土方挖填数量不大，综上土石方平衡分析，该工程建设过程中土石方挖填平衡，符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的规定要求。

3.2.4 取土（石）场设置评价

本项目建设前场地已平整完成，根据土石方平衡方案，挖填土方在项目建设区内实现总体平衡，不存在外调土方问题，因此本项目建设中不设取土场。

3.2.5 弃土（石、渣）场设置评价

本项目建设中不新增弃渣场，不存在选址影响因素。项目运行中的生活垃圾按照要求，通过垃圾箱收集有序堆放，及时清运至城市生活垃圾处理场进行填埋处理。

综上所述，主体工程土石方达到平衡，做到了开挖土方的全部利用，土石方平衡合理，项目可行。

3.2.6 对主体设计的施工组织进行评价

(1) 建设项目施工时序为场地平整后，将临时挖方堆置于指定区域后，进行基础开挖和施工，工序交错安排，同时进行，施工组织合理周密，大大缩短了施工工期，同时也缩短弃土（石）的堆放时间，从一定程度上减少了水土流失量。

(2) 施工中充分考虑了开挖的土石方的利用。工程回填中充分利用开挖方，这样做减少了工程开挖的弃渣量，同时降低了工程中建筑材料的成本和减少了工程的投资。

(3) 施工进度与时序安排最大限度缩短了工期，合理安排制定施工顺序。从水土保持角度分析，认为该项目施工组织安排合理，满足施工和水土保持的要求。

3.2.7 主体工程施工方法和施工工艺的评价

主体工程设计中，有较全面的施工组织设计，对不同时段、不同季节都有较详细的施工方案，施工方法得当、工艺先进。建筑工程采用机械配合人工施工，工序安排合理、施工效率高、工期短，缩短了扰动地表裸露时间，符合水土保持要求。

本工程地处宁县平子镇平子村，项目临近乡镇街道，道路已建成硬化，可直接利用，无须开辟施工道路，减少了临时占地面积，符合水土保持要求。

本工程主体建设挖方主要为建筑物基础开挖，在施工过程中通过调配，实现进行废方利用，达到土石方平衡。

在施工布置上，将材料加工场地、材料堆放地、临时办公生活区、机械停放地集中布置在同一区域，减少了施工占地及施工对地面的扰动，符合水土保持要求。

根据工程同期建设、同时投入使用的特点，在防洪、排水工程基础挖填施工时，各区域按序施工，工期安排紧凑合理，尽可能缩短了地表暴露时间，符合水土保持要求。

根据上述分析，主体工程施工组织、方法与工艺设计基本合理，但缺少土方临时拦挡、覆盖及场地临时排水处置措施，雨季水土流失严重。按本方案设计完善临时防护措施后，可满足水土保持要求。

3.3 主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

分析主体工程中具有水土保持功能的工程，有利于充分利用主体工程中具有水土保持功能工程的防护作用，通过对主体工程各类措施分析，具有水土保持功能的措施如下：

(1) 主体工程沿区域道路布设雨水排水管、雨水收集口等措施，将区域内雨水排入市政雨水管网，这些措施有效地防止了水土流失，具有一定的水土保持功能。

(2) 主体工程设计除建筑物和区域道路及配套设施外的用地全部绿化美化，并提出了绿地率达到 35.0%。

3.3.1 主体工程设计中水土保持措施界定

3.3.1.1 水土保持措施界定的原则

(1) 主导功能原则。

以防治水土流失为主要目标的工程，其设计、工程量、投资应纳入水土保持设计中；以主体工程设计功能为主、同时具有水土保持功能的工程，其设计、工程量、

投资不纳入水土保持设计中，仅对其进行水土保持分析与评价。

（2）责任区分原则。

对建设过程中的临时征地、临时占地，因施工结束后将归还当地群众或政府，基于水土保持工作具有技术性质的特点，需要将此范围的各项防护措施作为水土保持工程，计入水土保持设计。

（3）试验排除原则。对主体设计功能和水土保持功能结合较紧密的工程，可按破坏性试验的原则进行排除。假定没有这些工程，在没有受到土壤侵蚀外营力的同时，主体设计功能仍可以发挥作用的，此类工程即可看作以防止土壤侵蚀为主要目标，应算做水土保持工程，计入水土保持设计。根据此原则界定，本方案将主体设计中的雨水排放系统、绿化美化树种等绿化措施纳入水土保持工程。

3.3.2 水土保持工程界定的做法

1、植物措施均为水土保持工程

根据上述原则，所有植物措施均是基于水土保持功能为主要目标的，均计入水土保持工程。对原设计中不够详细的林草措施，本水土保持方案结合绿化美化的需要，结合园林绿化的宜居美化要求进行植物品种的配置等细化设计，并估算水土保持投资。

2、临时防治措施均为水土保持工程

临时措施在验收时可能不复存在，也不为主体工程所重视，在主体工程设计和监理中连一个单元工程都不算，但在施工过程中控制水土流失起到关键作用，应计入水土保持工程。

3、各类排水、截水、降水蓄渗工程均为水土保持工程

项目建设区设计的蓄排水工程、沉砂池、具有蓄水功能的雨水水池为水土保持工程。相反，项目运行产生的给水、引水、排水工程等，均不能计入水土保持工程，依据试验排除原则，若没有这些工程，主体工程无法正常运行。

3.3.3 不纳入水土保持方案中的主体工程设计措施

主体工程设计中出于运行安全考虑而布设的防护措施，虽然具有一定的水土保持功能，但防护目的与水土保持措施有较大差异，在本方案中只做水土保持分析，不纳入方案设计的水土保持防护措施体系，不计入水土保持投资。主要有：基础回填工程等。

3.3.4 主体设计已有水土保持措施及投资

对主体工程设计的地表工程中，以防治水土流失、改善项目区生态环境为主要目标的措施纳入本方案设计的水土保持防护体系，同时计列投资。主要有雨水管网、绿化等。

3.4 纳入水土保持方案中的主体工程设计措施

1) 雨水排放工程 本项目界定为水土保持的排水措施主要为排水管网、雨水收集口。为了将楼房建筑区内多余雨水排出，主体沿小区内道路布设集雨水排水管与市政雨水管网相接。

2) 透水砖铺设 小区走道铺设透水砖，具有水土保持作用。

水土保持评价：通过雨水管网、雨水收集口及透水砖铺设，可以有效的收集地表径流水，使区内汇水以有序的、安全的方式出流及吸纳，很好的保证了项目建设区排水的畅通，可以避免因雨水造成新的水土流失，具有很好的水土保持作用和防治效果。因此应计入水土保持工程。

3) 绿化美化

主体工程考虑对区内空闲场地采取庭院式绿化，绿化区主要包括楼宇旁绿地、围墙四周绿地、零星绿地等。主体工程规划中绿地面积为 2319.34m^2 。各项绿化措施能大大改善项目区生活、生态环境，提高了生活品质。就水土保持而言，即可提高地表的覆盖率，防治雨水对地表的直接冲刷，增强土壤的保水、抗蚀能力，有利于自然恢复期减少水土流失。主体工程的绿化设计满足水土保持要求，本方案不再补充设计。

水土保持评价：项目区布设的景观绿化措施不仅可以起到美化环境、减轻并防治污染、净化和改善大气的环境质量等作用，还可以改变地温和气温。植物体通过根系对土壤的固着作用，以及植物枝叶和地被植物而定土壤改良作用能达到涵养水源的目的，并能降低和防止雨水冲刷，阻止或减少地表径流，避免水土流失，其本身就是水土保持措施，因此计入水土保持工程。

3.5 结论性意见

综上所述，该项目主体工程设计中，根据现场地形、地质情况，依照相关设计规范，考虑到项目建筑安全与施工安全，主体工程设计采取了一系列工程措施和植物措施，这些措施的设计符合水土保持的要求，是合理可行的。对于绿化工程在径

流拦蓄利用方面的不足，致使大量雨水资源流失，对区域防洪造成一定压力。在水保工程优化设计中进一步补充完善，达到节水型社会相关要求的设计理念。

4 水土流失预测

项目在工程建设期将有大量土方开挖和填筑，损坏地表植被及现有水土保持设施，增大地表裸露面积；运行期将产生大量的径流等。对此若不及时采取有效的防护措施，可能会造成严重水土流失。准确预测工程建设造成的水土流失及其危害，将为有针对性地布设水土流失防治措施，有效防治因项目建设新增水土流失提供科学依据，水土流失预测范围为项目水土流失防治责任范围，水土流失预测内容包括土壤流失量预测及水土流失可能造成的危害分析。

4.1 水土流失的影响因素分析

4.1.1 影响因素分析

项目建设对当地的水土流失影响因素，主要是工程建设期的各种施工活动，重点在各单项工程的土建施工阶段，这些施工活动改变了项目区原有的地形地貌，破坏了水土资源和植被，最终导致水土流失的加剧。

项目建设所造成水土流失及环节的分析，见表 4-1。

表 4-1 新增水土流失影响因素分析表

影响因素	表现形式	影响结果
剥离、夷平	清除地表残余物及表土，平整场地	扰动地表，导致土地裸露
堆 积	建筑垃圾、弃土	形成裸露高陡边坡
填 筑	基础土方填筑	形成相对高陡边坡
开挖、回填	基坑挖填	局部扰动地表

4.2 水土流失预测内容和方法

4.2.1 水土流失预测的内容

根据《生产建设项目水土保持技术标准》的要求，结合本项目建设特点，水土流失预测内容包括：

- 1、扰动原地貌、损坏土地和植被的面积；
- 2、弃土（渣）量；
- 3、损坏水土保持设施的面积
- 4、可能造成水土流失量；
- 5、可能造成水土流失危害。

4.2.2 水土流失预测的方法

- 1、扰动原地貌、损坏土地和植被面积预测方法

通过查阅主体工程方案设计，结合实地勘测，预测工程建设过程中扰动原地貌

的面积、占压土地情况、损坏植被面积。

2、弃土、弃渣量预测方法

分析研究主体工程方案设计中的各部位挖填土方量、时序及进度，以填方尽量利用挖方为原则，通过土方挖填平衡，预测工程建设的弃土量。

3、损坏水土保持设施面积

根据工程各类土地面积、结合现场调查测算。

4、可能造成水土流失量预测方法

本项目可能造成水土流失量的预测方法采用类比法，并参考当地部分实测、调查结果。通过选取与本项目地形地貌、水文气象条件、工程性质相似工程项目，进行类比分析，综合确定计算参数，分别对不同部位或区域、不同时段可能造成水土流失量进行预测。

5、可能造成水土流失危害预测方法

通过对项目建设特点的分析，预测项目建设可能对项目区生态环境、管道行洪、地表水质以及项目自身安全等方面造成的不利影响。

4.2.3 项目建设中扰动原地貌、损坏土地和植被面积预测

项目建设过程中，土方的开挖、填筑、堆积，地表的剥离、碾压、夷平、占压等活动，都将不同程度地扰动原地貌，造成土地和地表植被的损坏。根据对主体工程设计报告的分析及现场勘察，本项目在建设过程中扰动原地貌、损坏或占压土地、植被的面积即为建设区用地面积6626.67m²，用地性质为商业用地。施工结束后，工程已完成，水土保持工程主要工程措施已完善，进入自然恢复期，其面积减少为2319.34m²。详见表4-2。

表 4-2 扰动原地貌、损坏土地和植被面积情况表

区域类别	占地性质	用地性质	占地数量(m ²)	
			施工期	自然恢复期
楼房建筑区	永久	商业用地	1371.40	0
院落硬化区	永久	商业用地	2935.93	0
绿化美化区	永久	商业用地	2319.34	2319.34
合计			6626.67	2319.34

4.3 弃土、弃渣量预测

1、弃土量预测

根据“2.4土石方平衡”计算结果，本项目建设中土方开挖10971.2m³，回填11094.6m³，借方123.4m³，调出方2066.2m³，调出方前期临时用密目网苫盖，后期

用于绿化区回覆、楼房建筑区基础回填、院落硬化区基础回填等。项目土石方总体平衡利用，不产生弃方。主体工程土石方量平衡详见表2-4。

4.4 土壤流失量预测

4.4.1 水土流失预测单元划分

准确预测项目建设造成的水土流失及其危害，将为有针对性地布设水土保持防治措施，为有效防治新增水土流失提供科学依据。

从空间分布上，根据水土流失影响因素、特点的不同，通过对场地利用的初步平衡分析，将施工区域分为：楼房建筑区、院落硬化区和绿化美化区。

4.4.2 水土流失预测时段划分

按照《生产建设项目水土保持技术标准》要求，预测时段从时间考虑主要为建设期，运行期水土保持措施发挥正常作用，暂不做预测。

建设期包括施工期（含施工准备期）、自然恢复期。施工期预测时段主要根据主体工程各部位的施工特点、进度安排确定，施工时段按最不利情况考虑，不足 1 年的按 1 年计算。自然恢复期主要考虑在方案服务期限内，被扰动的地表或者被改变的地貌，重新恢复稳定所需的时间。根据当地气候、土壤条件、建设规模及项目区处于半干旱半湿润区，自然恢复到充分发挥水保功能需要 3 年，因此自然恢复期预测时段取 3 年。

水土流失预测时段具体划分见表 4-3。

表 4-3 水土流失预测单元及预测时段表

序号	项目区域	面积(m ²)			预测时段（年）		
		建设期		运行期	建 设 期		运行期
		施工期	自然恢复期		施工期	自然恢复期	
1	楼房建筑区	1371.40	0.00		2		
2	院落硬化区	2935.93	0.00		2		
3	绿化美化区	2319.34	2319.34		2	3	
合 计		6626.67	2319.34				

4.4.3 侵蚀模数的确定

(1) 土壤侵蚀模数背景值的确定

根据宁县的实地情况，参照遥感影像解译结果，结合本工程区域的地形、地貌、降雨雨量、土壤类型等水土流失影响因素及预测对象受扰动情况，参照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）结合《全国第二次土壤侵蚀普查》结果，以甘肃省水土保持区划图集作为校正依据，并根据甘肃省土壤模数等值线图确定项目建设区

土壤侵蚀模数背景值为 2000t/km² a。土壤侵蚀强度为轻度侵蚀。

(2) 地表扰动后各预测（调查）区土壤侵蚀模数的确定

项目区扰动后土壤侵蚀模数的确定是按规范要求由原地貌侵蚀模数乘以加速侵蚀系数。本项目区加速侵蚀系数是按工程建设过程中对地表、植被的扰动程度不同，确定其加速侵蚀系数。根据黄委会西峰水土保持科学试验站研究资料，该地区扰动后土壤侵蚀模数一般为原地表土壤侵蚀模数的 2~5 倍。经咨询专家并综合项目建设特点综合分析，本项目建设过程中扰动后加速侵蚀系数平均按 3 倍计算，最终得出施工期扰动后土壤侵蚀模数为 6000t/km².a。

(3) 自然恢复期土壤侵蚀模数

通过对项目区地质、地貌、气候因素调查分析，在工程建设完工后，地表在裸露状态下，植被自然恢复要达到原地貌植被的 70%以上，才可产生与原地貌相近的水土保持功能，参照宁县同类工程自然恢复期同类地类土壤侵蚀模数递减系数，并根据本项目水土保持流失因子变化，第一年、第二年和第三年的递减系数分别是 70%、50%、和 30%，通过适当调整，经过计算。扰动后土壤侵蚀模数详见表 4-4。

表 4-4 扰动后土壤侵蚀模数表

项目分区	原地貌土壤侵蚀模数 (t/km ² a)	施工期土壤侵蚀模数 (t/km ² a)	自然恢复期土壤侵蚀模数 (t/km ² a)			平均土壤侵蚀模数 (t/km ² a)
			第一年	第二年	第三年	
楼房建筑区	2000	6000				
院落硬化区	2000	6000				
绿化美化区	2000	6000	4200	3000	1800	3000

3、预测结果

(1) 施工期水土流失量预测

根据预测，本工程施工期水土流失面积 6626.67m²，在不采取防治措施的情况下，原地表水土流失量 26.51t，扰动后水土流失量为 79.52t，新增水土流失量为 53.01t。详见表 4-5。

表 4-5 施工期可能造成水土流失量

预测单元	水土流失面积 (m ²)	原地貌侵蚀模数 (t/km ² a)	扰动后侵蚀模数 (t/km ² a)	预测时段 (a)	原地貌侵蚀量 (t)	扰动后侵蚀量 (t)	新增侵蚀量 (t)
楼房建筑区	1371.40	2000	6000	2	5.49	16.46	10.97
院落硬化区	2935.93	2000	6000	2	11.74	35.23	23.49
绿化美化区	2319.34	2000	6000	2	9.28	27.83	18.55
合 计	6626.67				26.51	79.52	53.01

(2) 自然恢复期水土流失量预测

根据预测，本工程自然恢复期水土流失面积为 2319.34m²，原地表水土流失量

4.64t，扰动后的水土流失量为 20.87t，新增水土流失量为 16.23t。详见表 4-6。

表 4-6 自然恢复期可能造成水土流失量

预测单元	水土流失面积 (m ²)	原地貌侵蚀模数 (t/km ² a)	扰动后侵蚀模数(t/km ² a)			原地貌侵蚀量 (t)	第一年扰动后侵蚀量 (t)	第二年扰动后侵蚀量 (t)	第三年扰动后侵蚀量 (t)	新增侵蚀量 (t)
			一年	二年	三年					
绿化美化区	2319.34	2000	4200	3000	1800	4.64	9.74	6.96	4.17	16.23
合 计	2319.34					4.64	9.74	6.96	4.17	16.23

(3) 新增水土流失量预测

综上所述，本工程建设期（施工期）可能产生的水土流失总量为 100.39t，其中施工期可能产生的水土流失量为 79.52t，自然恢复期可能产生的水土流失量为 20.87t。

新增水土流失总量为 69.24t，其中施工期可能产生的水土流失量为 53.01t，自然恢复期可能产生的水土流失量为 16.23t。

4.5 可能造成水土流失危害预测

1、对生态环境造成影响

项目建设中扰动原地貌、占压土地，损坏地表植被，使表层土壤结构遭到破坏，土壤抗侵蚀能力降低，植被退化，恶化周边生态环境。

2、容易造成风蚀引起的水土流失

项目在工程建设过程中，由于土石方开挖而引起的水土流失如若不加以治理，势必会使周围的环境遭到破坏，而且大风干旱季节，在风力作用下容易造成项目区因风蚀作用而引起水土流失。另外项目建设在基础开挖和回填时的土方堆积及其它土方工程都存在较为严重的水土流失隐患，若不采取必要的防护措施，一旦遇到强降雨，地表水迅速汇流会引起面蚀和沟蚀，造成严重水土流失，威胁建筑物安全，影响周边道路的正常安全运行。

3、对水资源的影响

项目在建设和运行过程中因地表硬化、破坏地形、地貌、植被等水土保持设施，使原有的水土保持功能降低直至丧失。地表的硬化或覆盖，使降雨不能下渗，土壤渗流系数减少、地表径流系数增大，使得地下水源的涵养和补给受到阻碍，地表径流汇流时间缩短、强度加大，地表径流量的增加，导致地下水补给量的减少，将对项目区水资源产生较大影响。

4.6 预测结果及综合分析

1、预测结果

(1) 扰动地表面积

根据项目建设有关资料统计和实地调查，工程建设过程中将扰动地表面积 0.66hm^2 。

(2) 弃土（渣）量

根据“2.4土石方平衡”计算结果，本项目建设中土方开挖 10971.2m^3 ，回填 11094.6m^3 ，借方 123.4m^3 ，调出方 2066.2m^3 ，调出方前期临时用密目网苫盖，后期用于绿化区回覆、楼房建筑区基础回填、院落硬化区基础回填等。项目土石方总体平衡利用，不产生弃方。主体工程土石方量平衡详见表2-4。

(3) 可能造成水土流失量

预测结果表明，本工程建设期（施工期）可能产生的水土流失总量为 100.39t ，其中施工期可能产生的水土流失量为 79.52t ，自然恢复期可能产生的水土流失量为 20.87t 。

新增水土流失总量为 69.24t ，其中施工期可能产生的水土流失量为 53.01t ，自然恢复期可能产生的水土流失量为 16.23t 。

(4) 损坏水土保持设施面积

根据工程各类土地面积、结合现场调查测算。工程建设过程中损坏水土保持设施面积 0.66hm^2 。

2、综合分析

(1) 土建工程施工时段水土流失比较严重，是本项目水土流失防治的重点区段。同时，也要重视其他区域的水土流失防治工作。

(2) 应针对不同的工程部位特点及其水土流失形式，采取不同的治理措施。对水土流失重点防治区段，其防护工程应采取工程措施、植物措施相结合的综合防护形式，建立排水沟、绿地等。

(3) 本项目属跨年工程，项目区降水每年集中在雨季 6~9 月，约占全年 65%，极易造成水土流失，因此应尽量避免雨季或大雨天气施工，并做好预防准备工作，防止水土流失大范围发生。

(4) 在项目建设期间，由于地表受到强烈扰动，极易造成严重水土流失，所

以要特别重视施工期的预防工作。通过优化施工组织设计，提高施工效率，同时采取临时拦挡、覆盖和排水等措施，并及时进行永久防护，以减少地表裸露时间和面积，减轻水土流失。

（5）项目的施工方案，特别是施工工艺和施工进度、施工工序的安排，决定着每一区段工程施工期间水土流失量的变化过程，水土流失预防措施、治理措施的实施则应顺应变化过程因地制宜、适时安排。

（6）及时掌握各重点区域和部位的水土流失动态及其防治效果，对于采取有效措施，减轻水土流失对项目的危害十分重要。

5 水土保持措施

5.1 防治区划分

5.1.1 分区依据

根据《生产建设项目水土保持技术标准》规定，结合项目建设的特点，按照有关规定和技术标准，将水土流失防治责任范围确定为项目建设区。

项目建设区包括生产建设项目的永久征地和土地使用管辖范围等土地权属明确，需由项目法人对其区域内的水土流失进行预防或治理的范围，其主要特点是必然发生与建设项目直接相关。

5.1.2 水土流失防治分区原则

- (1) 各区之间应具有显著差异性；
- (2) 同一区内造成水土流失的主导因子和防治措施应相近或相似；
- (3) 根据项目的繁简程度和项目区自然情况进行分区；
- (4) 各分级区应层次分明，具有关联性和系统性。

5.1.3 防治责任范围

依据分区依据、原则，结合本项目建设特点，该项目水土流失防治责任范围6626.67m²。其中：楼房建筑区面积为1371.40m²，院落硬化区面积为2935.93m²，绿化美化区面积2319.34m²。

5.1.4 防治分区及水土流失特点

按照《生产建设项目水土保持技术标准》要求，结合项目建设施工和运行特点，将项目建设区域划分为楼房建筑区、院落硬化区和绿化美化区三个防治分区。

(1) 楼房建筑区

楼房建筑区建设期因挖填、推平、碾压等活动，地表受到强烈扰动，将加剧土壤侵蚀。运行期建筑建成后，侵蚀迅速减弱。其水土流失形式主要为水蚀。

(2) 院落硬化区

院落及道路硬化区建设期因回填、推平、碾压等活动，地表受到强烈扰动，将加剧土壤侵蚀。运行期进行硬化治理后，侵蚀迅速减弱。其水土流失形式主要为水蚀。

(3) 绿化美化区

绿化美化区建设期因回填、推平、碾压、土方开挖和移动等活动，地表植被受

到强烈破坏，将加剧土壤侵蚀。运行期地表平整恢复绿化后，侵蚀迅速减弱。其水土流失形式主要为水蚀。项目防治分区详见表5-1。

表 5-1 项目防治分区表

防治分区		防治责任范围 (m ²)	水土流失特点
1	楼房建筑区	1371.40	水力侵蚀
2	院落硬化区	2935.93	水力侵蚀
3	绿化美化区	2319.34	水力侵蚀
合 计		6626.67	

5.2 防治目标

项目属建设类项目，按照《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区的复核划分成果》的通知（水利部办公厅，办水保[2013] 188 号），项目区属于黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区。结合项目及项目区实际，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB/T 50433-2018），本项目采用西北黄土高原区水土流失防治一级标准，确定水土流失防治目标为：水土流失治理度 $\geq 93\%$ ；土壤流失控制比 ≥ 1.0 ；渣土防护率 $\geq 92\%$ ；表土保护率不涉及（项目用地原地貌为露天型旧交易市场，由于市场的交易属性，人为扰动因素较大，原地貌无可剥离的有机质层表土，因此，本项目不进行表土剥离与回覆）；林草植被恢复率 $\geq 95\%$ ；林草覆盖率 $\geq 22\%$ 。

水土保持方案防治目标表详见表 5-2。

表 5-2 水土保持方案防治目标表

防 治 指 标	标准值		按降雨量调整	按侵蚀强度调整	按地貌类型修正	本方案采用的防治目标值
	施工期	设计水平年				
水土流失治理度 (%)	—	93				93
土壤流失控制比	—	0.8		+0.2		1.0
渣土防护率 (%)	90	92				92
表土保护率 (%)	90	90				不涉及
林草植被恢复率 (%)	—	95				95
林草植被覆盖度 (%)	—	22				22
备注：（1）土壤流失控制比在轻度侵蚀为主的区域不应小于 1 调整。（2）位于城市区的项目，渣土防护率和林草覆盖率可提高 1%-2%。						

5.2.1 设计内容与依据

本水保方案中，水保措施设计内容包括工程措施、植物措施和临时措施。工程措施主要有：排水管网、雨水收集口、透水砖铺设等；植物措施主要为通过景观树树种、绿篱、花卉等营造乔、灌、草绿地；临时措施主要有：临时截排水沟、临时沉沙池、编织袋装土拦挡、洒水降尘、密目网苫盖等。

依据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）、《生产建设项目水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）、《防洪标准》（GB50201-2014）、《排水设计规范》（JTJ 018-97）、《工程技术标准（JTG B01-2014）》。

5.2.2 主体设计水土保持措施评价

主体工程设计过程中考虑了主体施工可能引起的水土流失因素，并相应的提出了合理的解决方案。主体工程设计中采取的施工围栏、硬化路面、雨水蓄排系统、绿化措施具有较好的防治水土流失和美化环境作用。但根据建设项目工期长、开挖面较大，地面堆放物堆放时间较长等特点，本方案应补充完善以下几个方面的水土保持措施，进一步完善水土流失防治体系：

（1）应注重水资源保持护，完善透水设施内容。

（2）应注重对降雨的排导、集蓄利用，进一步提高对项目建设区径流拦蓄利用能力，重点补充完善低位绿地措施，提高雨洪径流的拦蓄利用率。

（3）进一步细化的绿化措施设计，建立健全植被恢复工程建设标准与内容。

（4）应重视施工期的临时防护，补充施工期的临时截、排水沟和临时拦蓄措施，对施工过程中的表土、回填土及建筑垃圾应分类分片集中堆存，并采取拦挡和苫盖等临时防治措施，以加强施工期间临时防治措施体系。

5.3 水土保持措施总体布局

本方案水土保持措施的布设本着“统筹全局、分区防治、合理安排、突出重点”和“因地制宜、生态优先”的原则，使工程、植物、临时拦挡等水保措施与施工管理有机结合，永久性、临时性、过渡性水保措施适时布设，乔木、灌木、草本植物适地立体配置，最终形成一个较为完整的、布设科学合理的水土保持综合防治体系。工程措施结合主体工程合理布设，植物措施主要布设于绿化区域，临时措施主要布设于楼房建筑区和道路及院落硬化区。水土保持综合防治体系见图 5-3。水土保持

措施工程量汇总表见表 5-4。

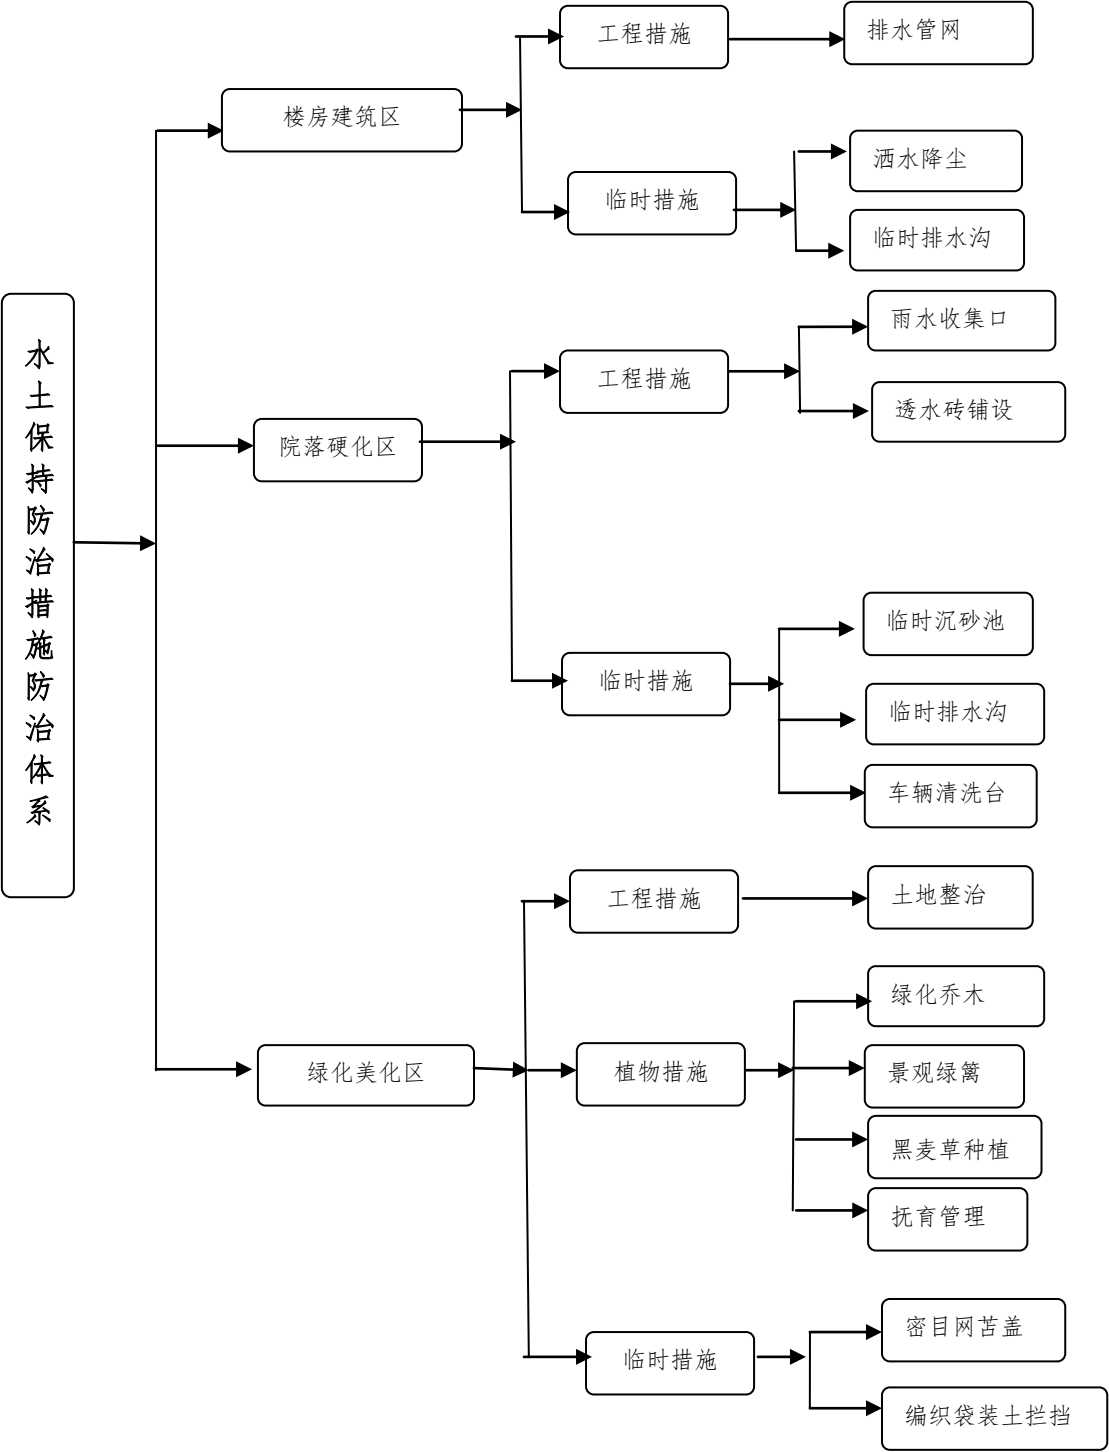


图 5-3 水土保持措施防治体系框图

表 5-4 各项水土保持措施工程量汇总表

分区	措施名称		单位	主体工程设计	方案设计
				数量	数量
楼房建筑区	工程措施	排水管网	m	515.0	
	临时措施	洒水降尘	m ³		180.0
		临时排水沟	m		75.0
院落硬化区	工程措施	雨水收集口	个	6	
		透水砖铺设	m ²	450.0	
	临时措施	临时沉砂池	处		1
		临时排水沟	m		78.3
		车辆清洗台	个	1	
绿化美化区	工程措施	土地整治	m ²		2319.34
	植物措施	绿化乔木	棵	59	
		小叶黄杨绿篱	m	160.0	
		花草种植	m ³	2100.0	
		抚育管理	年	2	
	临时措施	密目网苫盖	m ³		885.5
		编织袋装土拦挡	m		97.2

5.4 水土流失治理措施

1、楼房建筑区

(1) 工程措施

①排水管网：

主体设计中布设了较为完善的雨水主、支排水管网、各个区间汇流连接池、雨水检查井等雨水截排系统，并与场外市政排水管网顺畅对接，排水管网 515.0m。

(2) 临时措施

①洒水降尘：

施工期间，为防止风蚀引起的扬尘污染和水土流失，对项目建设区临时硬化道路、空地和车辆出入口根据空气状况，随时洒水降尘，洒水量按每天 2.5m³/天估算，洒水率按 30%计算，施工期需洒水降尘用水 180.0m³。

②临时排水沟：

由于该区汛期降水量较多，本设计排水沟采用即来即排。根据《生产建设项目水土保持方案技术标准》（GB50433-2018）规定、《防洪标准》（GB50201—1994）

等标准及该区已有建设项目排水工程设计经验，确定该方案排水工程洪水标准为 10 年一遇。确定临时排水渠断面为梯形，底宽 0.3m，高 0.4m，边坡比为 1:1。采用就地挖坑夯实后塑料布铺衬。临时排水渠设计比降为 1%，根据设计计算每米需挖方 0.28m³，每米需塑料布 1.43m²。

布设位置：本区域沿楼房主体周边布设临时排水沟，长度 75.0m。

(1)排水渠防洪标准

根据《生产建设项目水土保持方案技术标准》（GB50433-2018）规定，确定该项目排水渠设计标准采用 3-5 年一遇 3-6 小时最大暴雨 42mm。

(2)设计洪峰流量计算

洪峰流量采用下式计算：

$$Q=0.278kif$$

式中：Q—最大洪峰流量，m³/s；

k—径流系数；取 0.65

i—设计频率 33.3%降雨量，mm，查《甘肃省水文图集》，i=42mm；

f—集水面积，km²。

截水沟水文计算结果见表 5-5。

表 5-5 排水沟水文计算表

集水面积 f (km ²)	降雨强度 (mm)	设计流量 (m ³ /s)	备 注
	P=30%	Q	
0.0066	42	0.03	径流系数 K=0.65

(3)（截）排水沟断面设计

截水沟断面采用矩形断面土质渠，断面尺寸的按明渠均匀流公式计算：

$$Q = AC\sqrt{Ri}$$

式中：A——断面面积，m²；

Q——最大排洪流量，m³/s；

C——谢才系数；

R——水力半径，m；

i——比降。

1) 渠道断面面积

$$A = (b+c) h/2$$

式中：b——渠道底宽，m；

c—渠道水面宽，m；

h—渠道水深，m。

2) 水力半径：R=A/x

式中：x—渠道湿周，m。

$$X=b+2h(1+m^2)^{\frac{1}{2}}$$

m—边坡系数。

3) 谢才系数：

$$C = \frac{1}{n} R^{1/6}$$

式中：n=0.014—渠道糙率。

4) 渠道水力计算：临时排水沟断面水力计算结果详见表 5-6。

表 5-6 排水渠水力计算表

底宽 b(m)	安全 超高 (m)	水深 h (m)	边坡 比 m	过水面积 A (m ²)	湿周 X (m)	水力半径 R (m)	谢才系数 C	比降 I	过水流量 Q (m ³ /s)	流速 V (m/s)
0.30	0.10	0.25	1.00	0.18	1.09	0.16	52.45	0.01	0.03	2.08

2、院落硬化区

(1) 工程措施

①雨水收集口：

主体设计中布设了较为完善的雨水主、支排水管网、各个区间汇流连接池、雨水检查井等雨水截排系统，并与市政排水管网顺畅对接，主体设计雨水收集口 6 个。

②透水砖铺设：

依据主体设计资料，项目楼体周边人行步道硬化采用透水砖铺设，面积为 450.0m²。透水砖具有水土保持功能，本方案直接将其纳入水保措施体系。

(2) 临时措施

①临时沉砂池：

为防止各工程区集水将原地表及其汇水挟带泥沙排入场外雨水管网，本方案根据场地地势情况设置单箱型临时沉砂池 1 处，在建构筑物基础开挖临时堆土场、及部分道路区等位置设置临时排水沟，临时排水沟交汇出口位置与临时沉砂池顺畅连接。

沉砂池尺寸：根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99）和工程项目实

际，确定临时沉砂池的池箱断面为梯形。池箱底面宽 1.5m，长 2.5m，深 1m。临时沉砂池边坡比为 1:1。沉砂池进出水段为梯形，底宽 0.4m，高 0.4m，边坡比为 1:1，并与临时排水渠相连。施工时，沉砂池基础、池壁及进出水口渠道均用本土夯填，使其干密度达到 1.55t/m^3 以上，铺衬塑料布，沉砂池基础开挖量 $9.75\text{m}^3/\text{处}$ ，塑料布 $20.2\text{m}^2/\text{处}$ 。

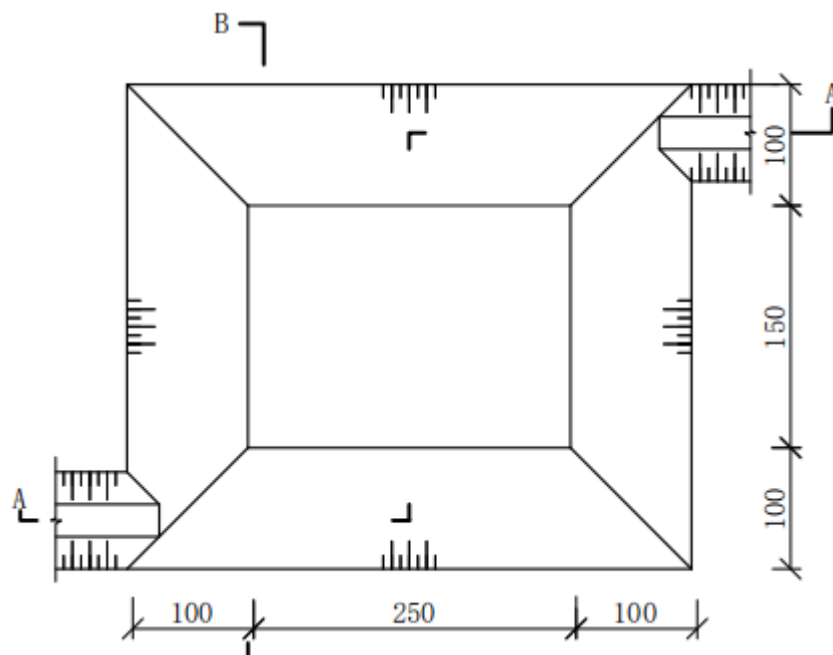


图 5-8 临时沉砂池典型设计

②临时排水沟：

本区域临时排水沟长度 78.3m。

③车辆清洗台：

由于本工程建设时，进出车辆较多，为了保证现场的文明施工环境及周边道路环境卫生不被污染，在施工场区大门内道路上设置出门车辆清洗台 1 处。

3、绿化美化区

(1) 工程措施

①土地整治：

为增加有效绿化面积，提高土地质量、利用效率和改善生态环境，对项目区绿化美化区土地进行平整、施肥等整治，面积 2319.34m^2 。

(2) 植物措施

1) 绿化植树:

植树穴为圆形，穴径 90cm、穴深 50cm，植树穴挖好后，换入种植土，采用“一提二踩三覆土”的栽植方式，栽植株行距为 2.0m，特殊地形适当调整栽植密度，根据不同天气适时适量浇水，保证苗木成活率。本项目共栽植乔木 59 棵，植物配置表详见表 5-9。

表 5-9 植物配置表

序号	树种	规格				数量	备注
		高度 (m)	冠径 (m)	胸径 (cm)	分枝点 (m)		
1	国槐	1.8-2.5	0.8-1.2	3.0-5.0	1.8-2.0	13	树形优美、生长健壮、无病虫害
2	红叶李	1.8-2.2	0.8-1.2	2.5-4.5	1.6-2.0	15	树形优美、生长健壮、无病虫害
3	雪松	1.8-2.5	1.2-1.5	3.0-5.0	0.8-1.5	11	树杆通直、生长健壮、无病虫害
4	白皮松	1.8-2.5	1.2-1.5	3.0-5.0	0.8-1.5	10	树杆通直、生长健壮、无病虫害
5	银杏	1.8-2.5	0.8-1.2	3.0-5.0	1.8-2.0	10	树形优美、生长健壮、无病虫害

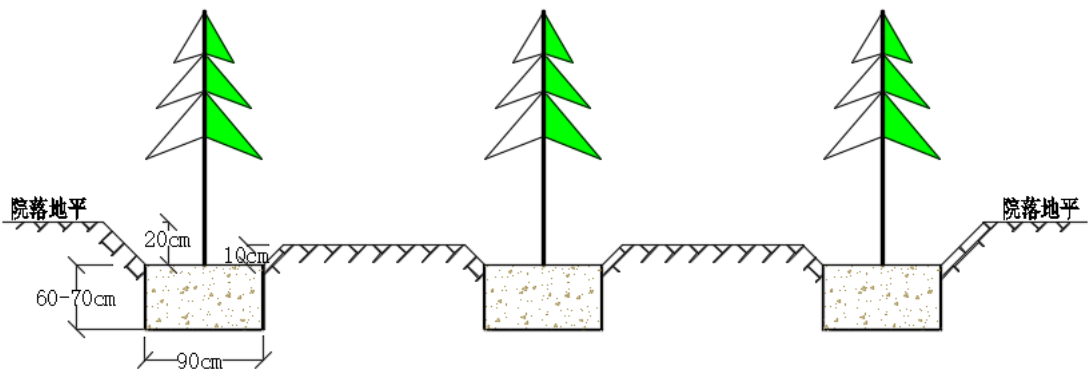


图 5-10 乔木栽植典型设计

2) 绿篱:

绿篱树种选用再生能力强的小叶黄杨，采用双排栽植的方式，绿篱宽度 50cm，株距 25cm，总长度 160.0m，需要绿篱小叶黄杨 1280 株。绿篱栽植技术措施指标表详见表 5-10，绿篱栽植图见图 5-11。

表 5-10 绿篱栽植技术措施指标表

绿篱	栽植方式	株距	绿篱宽度 (cm)	绿篱长度 (m)	用苗量 (株)
小叶黄杨	双排	25cm	50	160.0	1280

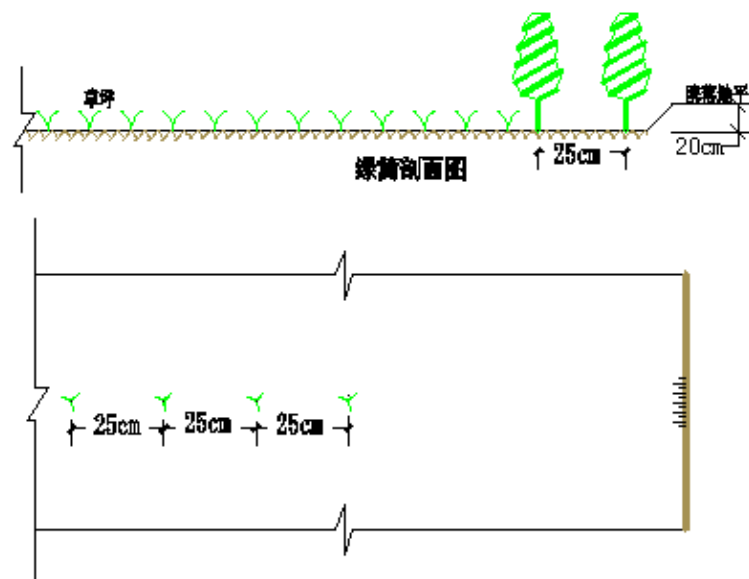


图 5-11 绿篱栽植图

3) 花草栽植:

花种选择较耐寒的月季与牡丹,栽植月季 12.0m²、牡丹 15.0m²,栽植密度与其他绿化树种穿插确定,需要月季 12 株、牡丹 15 株;

草坪种植草种选用黑麦草,种植方式采用撒播,播种量 2.3g/m²。点播面积 2100.0m²。

绿化树种苗木规格及栽植方式见表 5-10,

种植技术措施详见表 5-12,

花卉栽植技术见表 5-13。

表 5-12 草籽种植技术指标及用种量

序号	中文名	学名	级别	净度不低于 (%)	发芽率不低于 (%)	其它种子不多于(粒/公斤)	水分不高于(%)
1	多年生黑麦草	Lolium Perenne	一	97	90	500	12
			二	90	85	1000	12
			三	85	80	2000	12

注:牧草种籽选用一、二级。

表 5-13 绿化树种苗木规格及栽植方式

草种	整地深度	整地方式	覆土厚度 (cm)	单位面积实际播种量	种籽质量等级	种植方法	播种面积 (m ²)	需籽量 (kg)
黑麦草	30cm	全垦	2--3	2.3g/m ²	一、二级种子	撒播	2100.0	4.83

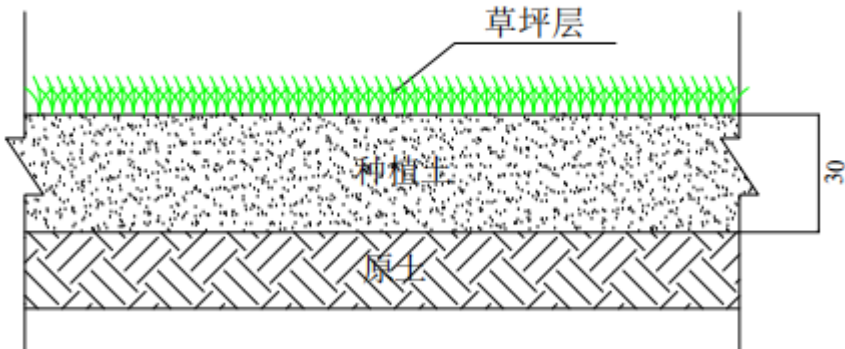


图 5-14 种草典型设计

表 5-15 种植技术措施

整地	黑麦草适宜于肥沃沙质壤土。在种植前要犁地及耙地各 3 次，必须做到深耕细耙，并拣净土中的石子、杂草等;然后使犁耙过疏松的田地，经太阳晒过几天，使之充分干燥(若潮湿，容易烂根)，再下基肥，每 667 平方米施 2500~3000 千克干粪，或 1500~2000 千克腐熟堆肥(草皮、草木灰、渣滓粪)，这时再进行犁地 1 次，耙平后即准备下种。
种植	一般以春季播种为宜，春播需地面温度回升到 12℃以上，土壤墒情较好时进行。人工撒播，一般种植深 2-3cm，播后震压。
管理	(1) 中耕除草，黑麦草植株矮小，如不经常除草，则杂草滋生，妨碍黑麦草的生长。栽后半月就应除草一次，5~10 月杂草容易滋生，每月需除草 1~2 次，入冬以后，杂草少，可减少除草次数，除草时结合进行锄松表土。(2) 追肥黑麦草的生长期较长，需肥较多，除施足基肥外，还应根据黑麦草的生长情况，及时追肥。一般追肥 3 次以上，第一次在 7 月中旬。

表 5-16 花卉栽植技术措施指标表

序号	树种	冠幅 (m)	绿化面积 (m ²)	苗木量(株)	苗龄及等级	栽植方式
1	月季	1.0	12.0	12	3 年生I级苗	植苗
2	牡丹	1.0	15.0	15	3 年生I级苗	植苗

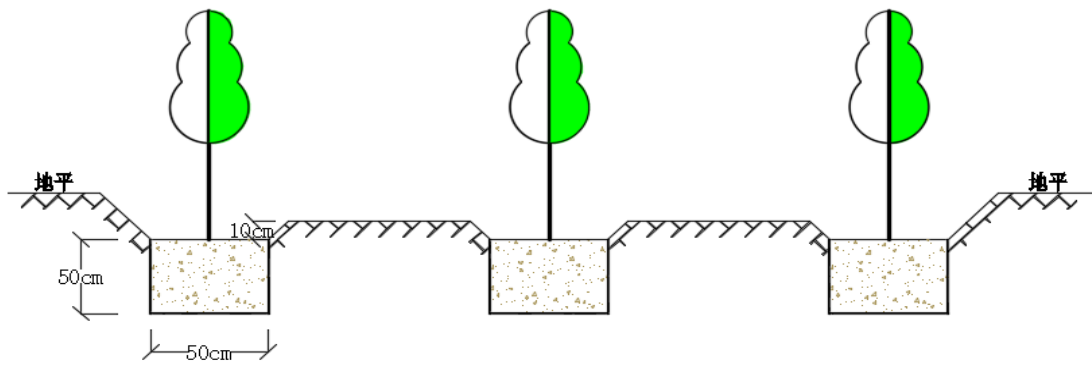


图 5-17 灌木栽植典型设计

花卉栽植技术要求：

花卉栽植采用景观孤植方式，根据绿化区总体布局需要，穿插于其它绿化树种或绿化区间，共计栽植株数 27 株。

①栽植前的准备。若土壤过于黏重，不利于花卉生长，首先应进行土壤改良，掺入树皮、锯木屑、稻壳、河沙及其他有机物，其目的是使土壤疏松通气，排水良好。

栽植前要施足底肥，以 100m^2 计，施入的基肥量应为堆肥或畜粪（牛、猪、羊粪）100kg、饼肥 10kg、骨粉和鱼粉 40—50kg、过磷酸钙 20kg、草木灰 20—30kg，分层施入。

栽植前，还应进行土壤消毒，消毒常用的化学药物有氯化苦（三氯硝基甲烷）、甲基溴、化虫、福尔马林（甲醛水溶液）等。消毒时将药物撒于表面，并与表土充分拌匀，然后用塑料薄膜密封。

②栽植。栽植时，将植株立于栽植沟内，使根系向四周散开，覆土后压实，浇透水。栽植深度将嫁接口埋于地下 2—3cm 为宜。

③栽植后的管理

月季较耐干旱，土壤不宜过湿，尤忌积水。因而浇水最好采用“见干见湿，浇则必透”的原则。为使月季花开得健壮鲜艳，肥料必须氮、磷、钾配合和有机、无机互补。

牡丹花素来喜肥，开花前每个月要追肥一次，可以用腐熟的芝麻饼、豆饼、棉籽饼或菜籽饼混合肥，牡丹花刚种下去就要把水浇透，然后可以视土壤的干湿情况来判断是否要浇水。每次追肥时要伴以浇水，并且注意要浇透。

（3）临时措施

①编织袋装土拦挡：

编织袋装土拦挡主要在基础开挖的过程中使用，防止雨水对临时堆土场的冲刷。袋中的土与临时堆土场中的土一并处理。土袋挡护的断面尺寸为顶宽 1.0m，底宽 2.5m，高 1.5m，单位工程量为 $2.625\text{m}^3/\text{m}$ 。

布设位置：在项目区两个临时堆土体周围共布设编制袋拦挡 97.2m，编制袋土填筑、拆除 255.2m^3 。

②密目网苫盖：

密目网苫盖主要在基础开挖及临时堆土体堆放的过程中使用，防止雨水对开挖土方及临时堆土体的冲刷，方案共布设密目网苫盖 885.5m^2 。

临时措施汇总表详见表 5-19。

表 5-19 临时措施汇总表

工程名称	单位	数量	备注
编制袋土填筑、拆除	m^3	255.2	新增
密目网苫盖	m^2	885.5	新增
临时排水渠	m	153.3	新增
临时沉砂池	座	1	新增
洒水降尘	m^3	180.0	新增
车辆清洗台	个	1	主体

5.4.1 预防措施及典型设计

5.4.1.1 预防措施

1) 优化主体工程施工组织设计

进一步优化主体工程施工组织设计，提高防护效果，减少占用、扰动地表面积，尽量减少项目建设造成的新增水土流失。

2) 规范施工

①尽可能地缩短疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开雨天施工。

②在雨季和汛期到来之前，应备齐工程临时防护用的物料及各种防汛物资，随时采取临时防护措施，以减轻雨水对主体工程的破坏和最大限度减少土壤的流失。

③施工机械和施工人员要按照施工总体平面布置图进行作业，不得乱占土地，施工机械、土石及其它建筑材料不得乱停乱放，防止损坏地表加剧水土流失。

④对全体施工人员进行水保知识的宣传和规范施工、文明施工的教育，以增强

其水土保持意识，将造成水土流失的人为因素降至最小。

⑤建设单位、施工单位应积极配合水保部门的监督检查。

3) 施工期临时防护

施工期的临时防护措施主要有：临时拦挡、临时防洪排水、临时绿化等措施，以预防因施工活动引发的水土流失，把施工活动造成的水土流失降至最低。施工期间的临时防护措施主要有：

①土方临时拦挡防护：各区施工初期，基础开挖的土方，要先将本区拟利用的部分集中堆放于空闲地或利用区域附近，高堆土边坡四周用编织土袋拦挡，表面覆盖密目网防护。

②各施工区段布设临时截（排）水沟。在基础开挖过程中，布设排、截水沟及场地临时蓄水池，防止各种水源进入开挖基础，影响施工进度。

③对施工区采取经常洒水降尘、运输车辆加盖蓬布等防止粉尘飞扬的措施。

总之，施工期的临时防护措施涉及各个方面，要求施工单位尽可能将其完善、细化，以使项目施工引发的水土流失得到有效地控制，施工环境尽可能改善。

5.4.1.2 典型设计

1、工程措施

(1) 土地整治

主体工程施工结束后，对扰动区域内需要绿化的用地栽种林草前先进行场地平整，对于面积较大的覆土区域主要采用推土机推平的方式施工，场地边角以人工平整为主，面积较小、施工车辆无法进入的区域采用人工平整的施工方式，清除杂物、石砾等，回覆表土，覆土厚度 25cm 左右，覆土后的地表高度要低于场地地平 20cm，以便于拦蓄场地内的雨水，减少雨水外流，减少灌溉用水。

2、植物措施

(1) 绿化树栽植

栽植方式：

绿化植树先挖树穴，植树穴挖好后，换入种植土杵实，乔木采用株距 2.0m，特殊地形密度可适当调整。根据不同天气适时适量浇水，保证苗木成活率。

栽植要点：

1) 选苗：苗木是绿化的基础，苗木质量的好坏直接影响到绿化效果，所用苗

木应符合以下标准：

I.严格按苗木规格，树形完整，冠形整齐，主干通直，根系完整。

II.树木移栽前 2-3 天应浇水，起苗后应分级、包装，整个过程应注意根部保湿，防止受冻和遭受风吹日晒，严防失水、损伤。

III.起苗后尽快栽植，不能及时栽植的，要假植，以防苗木失水。

IV.同一地块栽植的树种要求高度一致，生长状况良好。

2) 绿化用地的清理：绿化用地在绿化前进行整理，去除杂物、碎石、弃料弃渣等杂物，细耕细耙，使土壤质地均匀，以利于保墒蓄水。

3) 移植：移栽以阴而无风天气为佳，晴天适宜在上午 11 时前或下午 3 时前后进行，栽前先检查树穴，对有塌落的坑穴进行整理。栽前进行适当修理，栽植时要求根系舒展，深浅适当，根部埋土结合紧密。

4) 补植：栽植后及时检查树木的生长状况，根据成活率拟定补植措施，补植时要求树种相同，树形一致，高矮一致。

5) 抚育管理和更新补植：栽植后要经常检查，及时改善幼苗生长环境，适时浇水，严格管理，严禁破坏，确保其成活率，对于成活率小于 95%的部分要更新补植，确保郁蔽和发挥其固土保水功能作用。

丛植灌木还需要适时修剪。

表 5-20 植物措施施工工序

序号	工序	主要内容
1	整地	清理场地表面、植苗造林挖坑、播种整地。
2	籽（苗）选择	起苗、挑选、分级、包装运输，种籽去杂、选精、浸种、消毒、去芒、磨擦，以利种子出苗。种子处理。
3	定点放线	按设计要求在绿化用地上标出所栽植树木的准确位置。
4	栽植	栽植（落坑、扶正、回土、踏实）、浇水、覆土、保墒、清理现场及苗木现场搬用、施工期苗木养护。
5	抚育管理	包括中耕松土、除草、浇水、施肥、修剪、培土、病虫害防治等。
6	补植	检查、评定、补植。

3) 临时措施

(1) 施工期蓄排措施

施工期内，在场地内修建截、临时排水沟及临时沉砂池，保证区域内雨水全部集蓄利用，不向外排放。集蓄的雨水可用于施工用水或降尘、车轮除泥用水。

① 临时排水沟

由于该区汛期降水量较多，本设计排水沟采用即来即排。采用就地挖坑夯实后塑料布铺衬。根据《生产建设项目水土保持方案技术标准》（GB50433-2018）规定、《防洪标准》（GB50201—1994）等标准及该区已有建设项目排水工程设计经验，确定该方案排水工程洪水标准为10年一遇。确定临时排水沟断面为梯形，底宽0.3m，高0.4m，边坡比为1:1。采用就地挖坑夯实后塑料布铺衬。临时排水沟设计比降为1%，根据设计计算每米需挖方 0.28m^3 ，每米需塑料布 1.43m^2 。

土质临时排水沟应按设计依地势放线，按设计断面开挖渠道一次成形，再进行修边压实，保持渠道平整光滑。




图 5-16 临时排水沟典型设计图

② 临时沉砂池

为防止各工程区截排水沟集水将原地表及其汇水挟带泥沙排放，本方案根据场地地势情况，设置单箱型沉砂池。

根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99）和工程项目实际，确定临时沉砂池的池箱断面为梯形。池箱底面宽1.5m，长2.5m，深1m。临时沉砂池边坡比为1:1。沉砂池进出水段为梯形，底宽0.3m，高0.4m，边坡比为1:1，并与临时排水沟相连。施工时，沉砂池基础、池壁及进出水口渠道均用本土夯实，使其干密度达到 1.55t/m^3 以上，铺衬塑料布，单个沉砂池基础开挖量 $9.75\text{m}^3/\text{处}$ ，塑料布 $20.2\text{m}^2/\text{处}$ 。

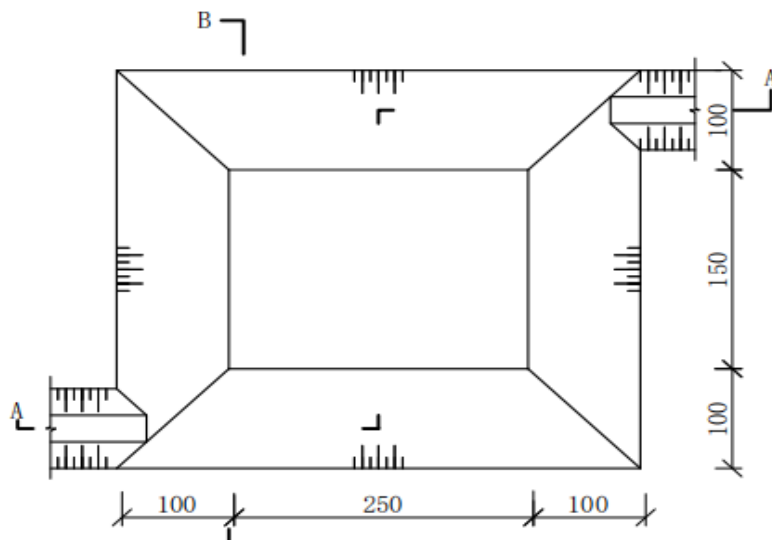


图 5-17 临时沉砂池典型设计图

(2) 编织袋装土挡墙

根据设计，准备相应数量的编织袋，充分利用临时堆置的弃土或临时存放的剥离表土，就地装填，不必再行开挖装填土料；然后将编织袋用尼龙绳扎牢封口，边装边堆砌挡墙；挡墙基础应整平夯实，沿临时堆土坡脚线进行挡墙码砌，编织袋之间左右挤紧靠牢，上下要错缝咬合，防止松动倒坍，土袋挡护的断面尺寸为顶宽 1.0m，底宽 2.5m，高 1.5m，单位工程量为 $2.625\text{m}^3/\text{m}$ 。

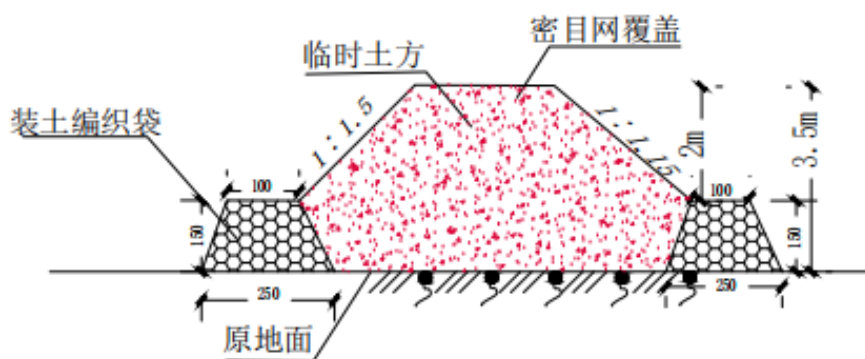


图 5-18 编织袋装土拦挡典型设计图

(3) 密目网苫盖

临时堆土体在外营力作用下容易引起水土流失，为防止临时堆土体的水土流失，临时堆土体表面采用密目网苫盖。本工程共布设密目网苫盖 885.5m^2 。

5.5 水土保持措施进度安排

根据水土保持设施与主体工程建设“三同时”的原则，合理安排措施实施进度。水土保持工程的实施与相应主体工程实施同步进行，并同时验收。

根据水土保持工程的规模，项目所在地区的自然条件、主体工程施工的总进度及有关规范、定额等，提出本工程方案实施安排及年度投资进度计划。主体工程水土流失防治措施与主体工程同步进行，在施工过程中边开挖边防护，工程完成后及时做好植被恢复工程。各项水土保持措施在主体工程施工期内全部完成。宁县平子镇聚星苑小区项目于 2022 年 4 月初开工建设，计划 2023 年 3 月底竣工，总工期 12 个月。实施进度安排见下面工程进度表。

表 5-21 水土保持工程施工进度表

年度		2022年										2023年		
月份		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
楼房建筑区	工程措施													
	临时措施													
院落硬化区	工程措施													
	临时措施													
绿化美化区	工程措施													
	植物措施													
	临时措施													

6 水土保持监测及监理

6.1 水土保持监测

按照《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）规定，编制水土保持方案报告书的项目，应当依法开展水土保持监测工作。本项目编制的是水保方案报告表，因此，本项目不再开展独立的水土保持监测工作，但建设单位要督促施工单位，依法做好水土流失防治工作。

6.2 水土保持监理

按照《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）规定，凡主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持监理标准和规定开展水土保持施工监理。本项目征占地面积为 0.663hm^2 ，小于 20hm^2 ，挖填总量 2.21 万立方米，小于 20 万立方米，水土保持项目施工监理纳入主体工程监理一并管理，不再开展独立的水土保持监理工作。

7 水土保持投资概算及效益分析

7.1 投资概算

宁县平子镇聚星苑小区项目水保工程措施包括院落透水砖铺设、排水管网布设、土地整治等；植物措施为草坪种植、绿化树栽植；临时工程包括临时堆土拦挡措施等。

本项目水土保持措施包括主体工程设计中已具有水土保持功能和方案新增水土保持措施两部分组成。主体设计水土保持措施工程量：透水砖铺设 450.0m²，排水管网 515.0m，增设雨水收集 6 个，土地整治 2319.34 m²，栽植绿化乔木 59 棵，种植景观草坪(黑麦草)2100.0m²，花卉(月季、牡丹)栽植 27 株，小叶黄杨绿篱 160.0m。

新增水土保持措施主要工程量：主要为临时水保措施等，详见第 5 章表 5-4 各项水土保持措施工程量汇总表。

7.1.1 编制依据

1、文件依据

(1) 中华人民共和国水利部《关于颁布〈水土保持工程概（估）算编制规定和定额〉的通告》（水总〔2003〕67 号）；

(2) 国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）；

(3) 《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号 2019 年 5 月 31 日）；

(4) 省发展和改革委员会、省财政厅、省水利厅印发《关于水土保持补偿收费标准的通知》（甘发改收费〔2017〕590 号）；

(5) 甘肃省住房和城乡建设厅发甘建价〔2011〕215 号《关于调整甘肃省建设工程税金费率的通知》；

(6) 水利部办公厅关于《调整水利工程计价依据增值税计算标准》的通知（办财务函〔2019〕448 号），2019 年 4 月 4 日；

(7) 财政部 税务总局 海关总署《关于深化改革有关政策的公告》(财政部 税务总局[2019]39 号公告)；

(8) 庆阳市住房和城乡建设局《关于公布庆阳市二〇二二年第二期建设工程材料信息价和机械租赁信息价的通知》（庆建建发〔2022〕112 号）；

(9) 甘肃省财政厅 甘肃省发展和改革委员会 甘肃省水利厅 人民银行兰州中心支行关于印发《甘肃省水土保持补偿费征收使用管理办法》的通知(甘财税【2019】14号)。

2、定额依据及费用标准

(1) 《水土保持工程概(估)算定额》(水利部,水总〔2003〕67号,2003年1月25日);

(2) 主体工程设计及投资估算;

(3) 本项目水土保持方案编制合同。

7.1.2 编制估算的方法

采用水利部规定的生产建设项目水土保持方案编制程序方法和相关要求,编制阶段按初步设计阶段编制。

根据水土保持方案中设计的各项水土流失防治措施数量,工程项目划分为工程措施、植物措施、临时措施、独立费用共四部分。各部分下设一级、二级、三级项目。采用投资概(估)算编制的有关规定,分别计算出人工、材料、机械台时费、电、水、风、砂石料、植物措施材料等基础单价,再根据水保工程设计量项计算汇总。得出工程措施、植物措施、临时措施以及独立费用共四部分的各项投资,按照工程项目实施的年度计划,分类汇总出总估算表和分年度投资表。

7.1.3 编制说明与估算成果

1、估算水平年

价格水平年确定为 2022 年。

2、基础单价及标准

一、基础单价编制

(1) 人工预算单价

人工预算单价采用主体工程人工单价,7.5 元/工时。

(2) 主要材料预算单价

①主要材料预算单价:由材料原价、包装费、运杂费及采购保管费组成。材料原价采用 2022 年第二季度市场调查价。工程措施采管费按照购买到场价加 2.3%计算,植物措施采管费按照购买到场价加 1.1%计算。

②施工电价:按照主体工程估算单价 1.00 元/kw h。

③施工水价:施工水价按 5.0 元/m³ 计算。

④施工机械使用费：按水利部办公厅关于《调整水利工程计价依据增值税计算标准》的通知（办财务函〔2019〕448号），按调整后的施工机械台时费定额和不含增值税进项税额的价格计算。施工机械台时费定额的折旧费除以 1.13 调整系数，修理及替换设备费除以 1.09 调整系数进行计算。

⑤砂石料单价：依据办水总〔2016〕132号，按不含增值税的价格计算，其最高限价按 60 元/m³ 计取。

⑥混凝土材料单价：参照《水土保持工程概估算定额》附录中的混凝土材料配合比表，计算砂浆单价。

二、工程单价编制

1、工程措施单价

工程措施单价由直接工程费、间接费、企业利润和税金及扩大部分组成，直接工程费包括直接费、其它直接费和现场经费。直接费指人工费、材料费和机械使用费三项。

（1）直接工程费

直接工程费是指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动的费用。由直接费、其它直接费和现场经费组成。

①直接费包括：人工费、材料费及施工机械使用费三项。本方案中套用《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》。

② 其它直接费是指直接费以外施工过程中发生的其它费用。按直接费的 4% 计算；

③ 现场经费包括临时设施费和现场管理费。按直接费的 5% 计算。

（2）间接费

间接费是指进行工程施工而进行的组织与经营管理所发生的各项费用。包括企业管理费、财务费用和其它费用，按直接工程费取值。依据办水总〔2016〕132号，间接费的调整系数，土石方工程取直接工程费 5.5%，混凝土工程取直接工程费 4.3%，基础处理工程取直接工程费 6.5%，其它工程取直接工程费 4.4%。

（3）企业利润

企业利润是指按规定应计入工程措施及植物措施的利润。企业利润按直接工程费与间接费之和的 5%（林草措施）、7%（工程措施）计算。

(4) 税金

依据办财务函〔2019〕448号，税金按直接工程费、间接费、企业利润之和的9%计算（增值税税率）。

2、植物措施单价

植物措施单价由直接工程费、间接费、企业利润和税金组成。直接工程费包括直接费、其它直接费和现场经费。

(1) 直接费指人工费和材料费二项；其他直接费按直接费的2%计算；现场经费按直接费的4%计算。

(2) 间接费：依据办水总〔2016〕132号，按直接工程费的3.3%计算。

(3) 企业利润：按直接工程费和间接费之和的5%(林草)、7%(工程)计算。

(4) 税金：依据办财务函〔2019〕448号税金按直接工程费、间接费、企业利润之和的9%计算（增值税税率）。

工程单价其它直接费、间接费、企业利润和税金取费标准详见表7-1。

表 7-1 其它直接费、间接费、企业利润和税金取费标准表

编号	费用名称		工程类别	计算基础	费率（%）
一	直接费	其他直接费	工程措施	基本直接费	3
			林草措施		2
		现场经费	工程措施	基本直接费	5
			林草措施		4
二	间接费		工程措施	直接费	5.5
			林草措施		3.3
三	企业利润		工程措施	直接费与间接费之和	7
			林草措施		5
	税 金			直接费、间接费、利润之和	9

三、估算编制

水土保持工程静态总投资由工程措施费、植物措施费、临时措施费、独立费用、基本预备费及水土保持补偿费组成。

1、第一部分：工程措施费

按设计措施量乘以措施单价进行编制。

2、第二部分：植物措施工程费

按设计绿化措施量乘以绿化措施单价进行编制。

3、第三部分：施工临时工程费

临时防护工程主要是临时排水措施、堆土临时防护措施，按设计工程量乘以工程单价进行编制。

4、第四部分：独立费用

①建设管理费：按方案投资第一至第三部分之和的 2% 计算，管理费为 0.39 万元；

②工程建设监理费：按照《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）规定，本项目不再要求开展独立的水土保持监理工作，不再另行计列水土保持监理费用。

③水土保持方案编制费：根据约定合同，编制费为 1.40 万元；

④水土流失监测费：按照《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）规定，本项目不再另行计列水土保持监测费用。所以，不计列监理费。

独立费用计算结果为 1.79 万元，详见表 7-2。

表 7-2 独立费用估算表

序号	费用名称	编制依据及计算公式	金额（万元）
①	②	③	④
一	建设管理费	一至三部分的 2%	0.39
二	工程建设监理费	根据水保〔2019〕160 号规定文件要求，征占地面积在 20 公顷以上或者挖填土石方总量在 20 万立方米以上的项目，应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师，本项目占地面积、挖填总量小于此规定，因此，不计列监理费	0.0
三	水土保持方案编制费	按编制合同计列	1.4
四	水土保持监测费	根据水保〔2019〕160 号规定“编制水土保持方案报告书的项目，应当依法开展水土保持监测工作，本项目为编制的报告表，因此，不再要求开展水土保持监测工作”	0.0
合 计			1.79

5、预备费

基本预备费按第一至第四部分之新增投资之和的 6% 计算。因物价指数为零，不计价差预备费。结果为 0.62 万元。

6、水土保持补偿费

按照省发展和改革委员会、省财政厅、省水利厅印发《关于水土保持补偿收费标准的通知》（甘发改收费〔2017〕590 号）确定的收费标准，对一般性生产建设

项目，按照征占用土地面积每平方米 1.4 元一次性计征。详见表 7-3

表 7-3 水土保持补偿费估算表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
①	②	③	④	⑤	⑥
一	损坏水土保持措施面积	m ²	6626.67	1.40	9277.34
合 计					9277.34

四、编制成果

本方案水土保持工程估算总投资22.60万元（其中新增水保11.80万元，主体设计已有水土保持措施投资10.80万元）。

在水土保持措施总投资中：

工程措施11.35万元；

植物措施1.16万元；

临时工程6.75万元；

独立费用1.79万元（本项目不计列水土保持监理与监测费）；

预备费0.62万元；

水土保持补偿费0.93万元；

水土保持投资估算详见 表7-4；

水土保持投资分部工程估算详见 表7-5；

水土保持投资工程单价汇总表 表7-6；

水土保持投资施工机械台时费计算表 表7-7；

水土保持投资主要材料预算价格汇总表 表7-8；

水土保持措施单价分析详见 附表1～附表5。

表 7-4

水土保持措施投资估算总表

单位：万元

工程或费用名称		工 程 措施费	林草 措施费	临时 工程费	独立 费用	合 计	新增投资
第一部分 工程措施		11.35				11.35	2.21
1	排水管网	6.19				6.19	
2	透水砖铺设	2.12				2.12	
3	土地整治	2.21				2.21	2.21
4	雨水收集口	0.83				0.83	
第二部分 植物措施			1.16			1.16	0.0
1	树木栽植		0.56			0.56	
2	花草栽植		0.51			0.51	
3	抚育管理		0.09			0.09	
第三部分 临时工程				6.75		6.75	6.25
1	编织袋土拦挡			5.39		5.39	5.39
2	密目网苫盖			0.50		0.50	0.50
3	土质截（排）水渠			0.09		0.09	0.09
4	沉砂池			0.016		0.016	0.016
5	洒水降尘			0.25		0.25	0.25
6	车辆清洗池			0.50		0.50	
第四部分 独立费用					1.79	1.79	1.79
1	建设管理费				0.39	0.39	0.39
2	工程建设监理费				0.00	0.00	0.00
3	水土保持方案编制费				1.40	1.40	1.40
4	水土保持监测费				0.00	0.00	0.00
基本费（一～四部分之和）						21.05	10.25
预备费						0.62	0.62
1	基本预备费（6%）					0.62	0.62
2	价差预备费					0.00	0.00
水土保持补偿费						0.93	0.93
总投资						22.60	11.80

表 7-5 水土保持分区措施投资估算表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（万元）	其中（万元）	
						新增	主体已设计
第一部分 工程措施					11.35	2.21	9.14
一	排水管网	m	515.0	120.15	6.19		6.19
二	透水砖铺设	m²	450.0	47.15	2.12		2.12
三	土地整治	m²	2319.34	9.51	2.21	2.21	
四	雨水收集口	个	6	1383.3	0.83		0.83
第二部分 植物措施					1.16	0.0	1.16
一	树木栽植	株	59		0.56		0.56
1	国槐	株	13		0.09		0.09
	苗木费	株	13	50.6	0.07		0.07
	栽植费	株	13	19.16	0.02		0.02
2	红叶李	株	15		0.11		0.11
	苗木费	株	15	52.5	0.08		0.08
	栽植费	株	15	19.16	0.03		0.03
3	雪松	株	11		0.09		0.09
	苗木费	株	11	60.7	0.07		0.07
	栽植费	株	11	19.16	0.02		0.02
4	白皮松	株	10		0.14		0.14
	苗木费	株	10	120.5	0.12		0.12
	栽植费	株	10	19.16	0.02		0.02
5	银杏	株	10		0.13		0.13
	苗木费	株	10	115.8	0.12		0.12
	栽植费	株	10	19.16	0.02		0.02
二	花草栽植				0.51		0.51
1	月季	株	12		0.06		0.06
	苗木费	株	12	50.0	0.06		0.06
	栽植费	株	12	1.1	0.001		0.001
2	牡丹	株	15		0.09		0.09
	苗木费	株	15	60.0	0.09		0.09

	栽植费	株	15	1.1	0.001		0.001
3	小叶黄杨	株	1280		0.33		0.33
	苗木费	株	1280	1.50	0.19		0.19
	栽植费	株	1280	1.1	0.14		0.14
4	黑麦草	hm ²	0.21		0.03		0.03
	籽种费	kg	4.83	25.3	0.01		0.01
	栽植费	hm ²	0.21	672.6	0.02		0.02
三	抚育管理	hm ²	0.23		0.09		0.09
1	第一年	hm ²	0.23	2164.11	0.05		0.05
2	第二年	hm ²	0.23	1557.01	0.04		0.04
第三部分 临时工程					6.75	6.25	0.50
一	编织袋土拦挡	m	97.2		5.39	5.39	
	编织袋土填筑、拆除	m ³	255.2	211.03	5.39	5.39	
二	密目网苫盖	m ²	885.5	5.68	0.50	0.50	
三	土质截（排）水渠	m	153.3		0.09	0.09	
1	土方开挖	m ³	42.9	13.28	0.06	0.06	
2	塑料薄膜铺衬	m ²	219.2	1.60	0.03	0.03	
四	沉砂池	座	1		0.016	0.016	
1	土方开挖	m ³	9.75	13.28	0.013	0.013	
2	塑料布铺衬	m ²	20.20	1.60	0.003	0.003	
五	洒水降尘	m ³	180.0	13.81	0.25	0.25	
六	车辆清洗台	个	1	0.5	0.50		0.50
合 计					19.26	8.46	10.80

表 7-6 工程单价汇总表

单位：元

序号	工程名称	单位	单价	其 中				
				直接费	间接费	企业利润	税金	扩大 10%
1	表土剥离	100m ²	126.38	93.37	5.14	6.90	9.49	11.49
2	表土回覆	100m ³	694.12	58.80	28.21	37.87	52.10	63.1
3	人工挖截（排）水沟	100m ³	1327.96	981.14	53.96	72.46	99.68	120.72
6	带土球栽植乔木（土球直径 40cm）	100 株	971.86	747.30	24.66	38.60	72.95	88.35
7	带土球栽植乔木（土球直径 60cm）	100 株	1916.15	1473.40	48.62	76.10	143.83	174.20
8	人工装、机动翻斗车运土	100m ³	3070.1	2313.69	92.55	161.96	222.81	279.10
9	花卉栽植	100 株	108.9	91.16	3.01	4.71	8.90	1.1
10	黑麦草种植	hm ²	672.6	517.19	17.07	26.71	50.49	61.15
12	编织土袋填筑、拆除	100m ³	21102.99	15591.53	857.53	1151.43	1584.04	1918.45
13	塑料布铺衬	100m ²	159.69	117.98	6.49	8.71	11.99	14.52
14	密目网苫盖	100m ²	568.27	424.28	18.67	31.01	42.66	51.66
15	洒水降尘	100m ²	1381.09	1025.25	51.26	75.36	103.67	125.55
16	抚育管理（1 年）	hm ² /年	2164.11	1632.96	53.89	118.08	162.44	196.74
17	抚育管理（2 年）	hm ² /年	1557.01	1174.86	38.77	813.01	116.87	141.55

表 7-7 施工机械台时费计算表

编 号				1	2	3	4	5	5	7	8	
机 械 名 称				推土机	胶轮车	拖拉机	机动翻斗车	砂浆搅拌机	压路机	振动器	风(砂)水枪	
规 格				74kw		37kw	1.0t	0.4m³	8-10t	1.1kw	6m³/min	
定 额 依 据				水保概(估)算 1031	水保概(估)算 3059	水保概(估)算 1043	水保概(估)算 3060	水保概(估)算 2002	水保概(估)算 1072	水保概(估)算 2030	水保概(估)算 2050	
一类费用	折旧费			16.81	0.23	2.69	1.08	2.91	5.18	0.28	2.33	
	修理及替换设备费			20.93	0.46	3.35	2.03	4.90	9.34	2.03	0.58	
	安装拆卸费			0.86		0.16		1.07				
	合 计			38.60	0.82	6.20	2.20	8.88	14.52	1.40	0.60	
二类费用	人工	7.50	元/工时	2.4		1.3	1.3	1.3	2.4			
				18.00		9.75	9.75	8.60	18			
	电	1.0	元/kwh					10.10		0.80		
								10.10		0.80		
	柴油	7.88	元/kg	10.6		5	1.5		4.5			
				83.49		39.38	11.81	0.00	35.44			
	风	0.12	元/m³								202.5	
											24.3	
	水	5.0	元/m³									4.1
											20.5	
	小 计				101.49	0.00	49.13	21.56	18.70	53.44	0.80	44.80
台时费（元/台时）				140.09	0.82	55.33	23.76	27.58	67.96	2.20	45.40	

注：按《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号），施工机械台时费定额的折旧费除以 1.13 调整系数，修理及替换设备费除以 1.09 调整系数，安装拆卸费不变

表 7-8 主要材料预算价格汇总表

编号	材料名称	规格型号	单位	材料来源地	预算价格(元)	原价(元)	备注
1	编织袋		个	宁县	1.00	1.0	关于公布庆阳市二〇二二年第二期建设工程材料信息价和机械租赁信息价的通知(庆建建发〔2022〕112号)
2	柴油	0#	kg	宁县	8.93	7.68	
3	砂子	中砂	m ³	宁县	131	125	
4	石子	1-4cm	m ³	宁县	131	125	
5	密目网		m ²	宁县	0.5	0.5	市场调查价
6	塑料薄膜		m ²	宁县	0.3	0.3	
7	水		m ³	宁县	5.0	5.0	
8	电	220v	kwh	宁县	1.00	1.00	
9	风		m ³	宁县	0.12	0.12	
10	黑麦草	种子	kg	宁县	25.3	25.28	主体或市场调查价格
11	苗木	国槐	株	宁县	50.6	50.6	
		红叶李	株	宁县	52.5	52.5	
		雪松	株	宁县	60.7	60.7	
		白皮松	株	宁县	120.5	120.5	
		银杏	株	宁县	115.8	115.8	
12	花卉	月季	株	宁县	50.0	50.0	
13		牡丹	株	宁县	60.0	60.0	
14		小叶黄杨	株	宁县	1.5	1.50	
15	化肥	尿素:含氮量大于 46%, 磷肥:P2O5 含量 16-18%, 均价	kg	宁县	2.64	2.15	
16	有机肥	土杂肥	m ³	宁县	20	20	
17	种植土		m ³	宁县	3	3	
18	人工单价		工时	宁县	7.5		

7.2 效益分析

本方案水土保持防治措施是紧密结合项目水土流失特点和主体工程实际作出的。方案实施后，项目建设新增的水土流失得到有效控制，水土流失危害将显著减轻，项目区域内生态环境会得到有效保护。水土保持工程具有良好的生态、经济和社会效益。本方案水土保持措施实施后，控制水土流失、恢复和改善生态环境的作用和效益。

7.2.1 分析依据

- (1) 中华人民共和国标准《水土保持综合治理效益计算方法》(GB/T15774—2008)；
- (2) 国家建设部、水利部等部门有关建设项目经济评估的规定；
- (3) 《开发建设项目水土保持工程投资估算与效益分析》（甘肃省水利厅水土保持局）。

7.2.2 分析原则

- (1) 坚持效益计算的数据资料来源确切可靠，根据方案布设的水土保持措施数量计算效益。
- (2) 《水土保持综合治理效益计算方法》规定的水土保持综合治理效益原则，在基础效益（保水、保土）的基础上，产生的生态效益、社会效益、经济效益。
- (3) 《生产建设项目水土保持技术标准》中规定的效益原则，水土保持效益主要是减轻和控制水土流失为主，通过对治理程度、拦渣量、林草植被覆盖率、土地平整情况的分析，根据调查了解的其它工程治理后的资料，预测水土流失控制量、防止弃渣流失、改善生态环境、间接增加经济收益等方面的效益。

7.2.3 内容和方法

水土保持效益按照《水土保持综合治理效益计算方法》及《开发建设项目水土保持工程投资概估算与效益分析》进行分析。采用方案各项措施实施前后直接对比的方法，分析计算预测期内的保土量，用保土量与预测新增土壤流失量的比率、分析土壤侵蚀控制程度，用林草覆盖面积分析生态恢复情况。

1、水土保持基础效益

根据方案布设的水土保持措施类型，水土保持基础效益计算雨水就地入渗情况和减少的土壤侵蚀量。计算方法按两个步骤：第一步先确定方案布设的各类水土保持措施的减侵指标，第二步根据方案布设的各类水土保持措施面积计算减少的侵蚀

量。

2、水土保持生态效益

根据方案布设的水土保持措施类型，水土保持生态效益采用定性、定量方法确定生态效益。生态效益采用方案布设的林草面积分析生态恢复情况及蓄水保土效益。

3、水土保持社会效益

通过水土保持方案各项措施的实施，保护和改善项目区的生态环境，使项目区员工及附近市民的生活和生产更加优越，产生巨大的社会效益。

7.2.4 水土保持基础效益

根据项目现状分析，施工中可能造成水土流失程度预测，以及补充完善后的水土保持指标，对项目建设设计水平年的各项治理措施完成进行汇总统计，对水土保持措施预期效益进行分析。

六率目标预测：

(1) 水土流失治理度：水土流失总治理度指项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。方案实施后，设计水平年预计治理水土流失治理达标面积为 6540.5m²，占水土流失防治责任范围面积 6626.67m² 的 98.7%。达到了方案目标的要求。

$$\text{水土流失治理度 (\%)} = \frac{\text{水土流失治理达标面积}}{\text{水土流失面积}} \times 100$$

(2) 土壤流失控制比指项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方公里年平均土壤流失量之比。项目建设区土壤流失允许值为 1000t/km² a。各项水土保持工程实施后，因工程施工造成的裸露面得到有效治理，减少了地面径流，增加土壤入渗，减轻土壤侵蚀，有效控制项目建设区的水土流失，使项目区土壤侵蚀模数逐步下降到 800t/km² · a，土壤流失控制比为 1.25，有效地控制了项目区的土壤流失。达到了方案目标的要求。

$$\text{土壤流失控制比} = \frac{\text{容许土壤流失量}}{\text{治理后每平方公里年平均土壤流失量}}$$

(3) 渣土防护率：指项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。项目采用适合项目特点的

开挖、回填施工工艺，施工期间的开挖回填后剩余的土方部分用于区内绿化回覆用土，部分利用于硬化区基础回填，项目建设无弃方量，最大限度防止了水土流失危害的发生。施工中临时堆土 2066.2m³，在堆土过程中不可避免的会造成一定的散溢，估算有效拦挡 2029.0m³。渣土防护率可达到 98.2%。达到了方案目标的要求。

$$\text{渣土防护率}(\%) = \frac{\text{实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量}}{\text{永久弃渣和临时堆土总量}} \times 100$$

(4) 表土保护率：指项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比。项目用地原地貌为露天型旧交易市场，由于市场的交易属性，人为扰动因素较大，原地貌无可剥离的有机质层表土，因此，本项目不进行表土剥离与回覆，项目建设中不涉及表土保护率。

$$\text{表土保护率}(\%) = \frac{\text{保护的表土数量}}{\text{可剥离表土总量}} \times 100$$

(5) 林草植被恢复率：林草植被恢复率指项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。方案实施后，水土流失防治责任范围内林草类植被面积 2286.9m²，可绿化区全部植被恢复面积 2319.34m²，林草植被恢复率达到 98.6%。达到了方案目标的要求。

$$\text{林草植被恢复率}(\%) = \frac{\text{林草类植被面积}}{\text{可恢复林草植被面积}} \times 100$$

(6) 林草覆盖率：林草覆盖率指项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百分比。方案实施后，林草植被面积最终达到 2319.34m²，林草植被覆盖率达到 35.00%。达到了方案目标的要求。

$$\text{林草覆盖率}(\%) = \frac{\text{林草植被面积}}{\text{项目建设区面积}} \times 100\%$$

本方案水土流失防治六率目标实现值详见表 7-9。

表 7-13

方案目标值实现情况评估

指标项目	目标值	评估依据	单位	数量	设计实现值	评估结果
水土流失总治理度	≥93%	水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积/水土流失总面积	m ² /m ²	6540.5./6626.67	98.7%	满足
土壤流失控制比	≥1.0	水土流失防治责任范围内容许水土流失量/治理后的平均土壤流失强度	t/km ² a/t/km ² a	1000/800	1.25	满足
渣土防护率	≥92%	水土流失责任范围内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量/工程弃土（石、渣）总量	m ³ /m ³	2029.0/2066.2	98.2%	满足
表土保护率	不涉及	水土流失责任范围内保护的表土数量/可剥离表土总量	m ³ /m ³	-/-	不涉及	不涉及
林草植被恢复率	≥95%	水土流失防治责任范围内林草类植被面积/可恢复的植被面积	m ² /m ²	2286.9/2319.34	98.6%	满足
林草覆盖率	≥22%	水土流失防治责任范围内林草类植被面积/总面积	m ² /m ²	2319.34/6626.67	35.00%	满足

7.2.4 生态效益

通过水土保持工程措施、植物措施和临时保护措施等各项措施的落实，将最大程度的减轻项目建设对环境的不利影响。随着项目的竣工完成，废弃物得到合理处置，避免了对环境的污染；水土保持措施工程措施使雨水得到合理高效利用和有序排放，植物措施效益的逐步显现表现在有效的拦蓄和吸收部分雨洪水，使环境进一步得到绿化美化。工程措施和植物措施综合效益的发挥，首先加大了地表径流就地拦蓄入渗，改善了地表径流状况，提高了地表径流利用率；其次，通过调节区域径流，降低了洪水含沙量；其三，改善和美化了项目区及周边生态环境，使区域生态系统功能增强，区域抗御自然灾害的能力提高，生态环境将明显改善和提高；其四，减轻了项目区和下游防洪压力及水土流失危害的发生。

7.2.6 防治效果分析

本方案实施后，施工扰动区的新增侵蚀得到治理，项目建设区域的生态将逐步得到恢复和提高，项目区的运行环境得到改善。本项目水土流失防治效果分析结果汇总见表 7-9，从该表分析可见，本方案各项水土保持措施达到或超过了预期的治理目标，水土保持效果显著，生态环境得到有效保护。

8 水土保持管理

为保证本项目水土保持方案顺利实施、项目建设新增水土流失得到有效控制、项目区及周边生态环境良性发展，项目建设单位应在组织领导、技术力量和资金来源等方面制定切实可行的实施方案、实施保证措施。本项目水土保持方案实施保证措施包括水土保持工程建设机构的落实和招投标、施工管理、监督管理、水土保持竣工验收、资金保障等各项刚性管理措施的有力支撑等方面。

8.1 组织管理

8.1.1 加强施工组织

为了保证本水土保持方案提出的各项水土保持防治措施的实施和落实，本方案采取建设单位治理的方式，设相应机构和专人负责落实项目建设中的水土保持管理和实施工作，按照水土保持方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位，保质保量地完成水土保持各项措施。同时通过施工培训等形式组织对施工单位《中华人民共和国水土保持法》的学习、宣传工作，提高工程建设者的水土保持法制意识和自觉行动意识。

8.1.2 实行项目建设招投标制

建设单位在主体工程招标文件中，按水土保持工程技术要求，把水土保持工程各项内容纳入招标文件正式条款中，中标后施工单位与建设单位需签定水土保持责任合同，以合同条款形式明确施工单位应承担的防治水土流失的责任范围、义务和惩罚措施。严格履行施工合同，按照水土保持方案要求实施水土保持措施，如需变更应依有关规定申请变更批准手续。

8.1.3 加强监督

水行政主管部门和流域管理机构应当加强对水土保持方案实施情况的跟踪检查。跟踪检查应当采取遥感监管、现场检查、书面检查、“互联网+监管”相结合的方式，实现在建项目全覆盖。现场检查全面推行“双随机一公开”，随机确定检查对象，每年现场抽查比例不低于 10%。对有举报线索、不及时整改、不提交水土保持监测季报的项目要组织专项检查。

水行政主管部门和流域管理机构应当加强生产建设项目水土保持设施自主验收的监督管理。对存在较严重问题的项目，接受报备的水行政主管部门应当组织开展现场核查。对不符合规定程序或者不满足验收标准和条件的，应当责令限期整改，

逾期不整改或者整改不到位的依法予以处罚，并追究相关单位和人员的责任。

8.1.4 资金来源及管理

(1) 资金来源

本项目属建设类项目，工程的各项水土保持措施所需资金均来源于项目建设总投资中，并与主体工程建设资金同时调拨使用，同时施工、同时发挥效益；建设单位应积极开展工作，落实资金，保证方案实施。

(2) 资金管理办法

建设单位应严格执行资金管理，建立专户、专账，专人管理，专款专用，避免挪用或非法占用，并提出管理监督措施，充分保证资金的供应与到位条件。水土保持设施竣工验收时建设单位应就水土保持投资估算调整情况、分年度投资安排、资金到位情况和经费支出情况写出总结。

(3) 水土保持补偿费的征收办法

根据《中华人民共和国水土保持法》第三十二条第一款规定：“在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能的，应当缴纳水土保持补偿费，专项用于水土流失预防和治理。专项水土流失预防和治理由水行政主管部门负责组织实施。水土保持补偿费的收取使用管理办法由国务院财政部门、国务院价格主管部门会同国务院水行政主管部门制定”。根据《财政部、国家发展改革委、水利部、中国人民银行关于印发<水土保持补偿费征收使用管理办法>的通知》（财综[2014]8号）规定中“第九条 开办一般性生产建设项目的，缴纳义务人应当在项目开工前一次性缴纳水土保持补偿费。”的规定，当地水保部门负责水土保持补偿费的征收工作，建设单位应按规定及时足额向水保部门交纳水土保持补偿费。

水土保持补偿费的具体征收范围和标准按甘财综[2019]14号和甘发改收费[2017]590号的规定执行，本项目应依规缴纳水土保持补偿费。

8.2 后续设计

本水土保持方案处于初步设计阶段，建设单位随后在主体工程初步设计及施工图设计中，应严格按照批复后的水土保持方案要求，完成水土保持初步设计和施工图设计，进一步优化措施配置与施工工艺，尽可能的采取先进技术与工艺和项目建设机械化程度，严格控制工期，确保水保工程措施质量，满足项目建设中绿化率目

标要求，最终达到项目建设中水土保持措施的全面落实和项目建设与运行中水土流失的全面防治。

8.3 水土保持工程监测

按照《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160 号）规定，编制水土保持方案报告书的项目，应当依法开展水土保持监测工作。本项目编制的是水保方案报告表，因此，本项目不再开展独立的水土保持监测工作，但建设单位要督促施工单位，依法做好水土流失防治工作。

8.4 水土保持工程监理

按照《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）规定，凡主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持监理标准和规定开展水土保持施工监理。本项目征占地面积为 0.663hm^2 ，小于 20hm^2 ，挖填总量 2.21 万立方米，小于 20 万立方米，水土保持项目施工监理纳入主体工程监理一并管理，不再开展独立的水土保持监理工作。

8.5 水土保持施工要求

水土保持措施的施工建设也应与主体工程一样：实行项目管理责任制、工程招标投标制和工程监理监测制的质量保证措施。建设单位要明确专人负责水土保持工作，并严格水土保持组织管理制度。承包合同中应明确施工单位防治水土流失的目标要求和责任，主体工程招标书中，要有水土保持方案内容的要求，并将水土保持的责、权、利列入主体工程招投标文件中。在施工建设时，要求主体工程施工单位应与水保方案措施施工单位尽量协调一致，避免因责任不清或考虑不周出现的水土保持措施落实不力等问题的发生，特别是该项目属于跨年度工程，建设方与施工方在施工合同中应明确施工期的防汛责任，对基础开挖、回填、弃方运输应尽量避免雨季施工，不能回避的要采取临时保护措施，确保建设期间不发生大的水土流失危害。施工单位在施工过程中要注意以下几方面：(1)要严格控制占地和开挖范围，严禁乱挖乱采。(2)水保防护措施(临时排水沟与拦挡措施等)要先于工程挖填，开挖、回填、弃方运输要尽量避免雨季施工，不能回避的要采取临时保护措施，避免施工初期的水土流失。(3)植物措施工程施工时，应注意加强植物措施的后期抚育工作，抓好幼林抚育和管护，确保各种植物的成活率，发挥绿化工程的水土保持效益。

8.6 水土保持竣工验收

8.6.1 水土保持竣工验收要求

在开发建设项目土建工程完成后，必须开展水土保持设施的验收工作，建设单位应当依据批复的水土保持方案报告表、设计文件的内容和工程量，按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保【2017】365 号）及甘水水保发【2017】381 号）的要求，对项目建设中的水土保持设施进行自验。

（一）组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。

（二）组织水土保持设施验收工作，明确验收结论。水土保持设施验收报告编制完成后，生产建设单位应成立由验收报告编制单位、监测单位、监理单位、方案编制单位、施工单位等组成验收组，依据水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，采取现场勘查、资料查阅、召开验收会等方式，开展水土保持设施验收合格的结论，水土保持设施验收合格后，生产建设项目方可通过竣工验收和投产使用。

（三）公开验收情况。除按照国家规定需要保密的情形外，生产建设单位在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告（甘水水保发【2014】259 号文件不再要求开展水土保持监测工作的除外）、水土保持监理总结报告（甘水水保发【2014】259 号不再要求施工监理的除外）。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。

（四）报备验收材料。生产建设单位应在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，向本水土保持方案审批机关报备水土保持设施验收材料。报备材料包括建设单位申请报备文件、水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告、水土保持监理总结报告、公开验收情况证明、第三方机构独立承担民事责任能力且具有相应水土保持技术条件的证明。生产建设单位、第三方机构、水土保持监测机构（甘水水保发【2014】259 号文件不再要求开展水土保持监测工作的除外）、水土保持监理机构（甘水水保发【2014】259 号不再要求施工监理的除外）分别对水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告等材料的真实性负责。

（五）验收的内容。按照《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（2002

年水利部 16 号令，2005 年 7 月 8 日修定）以及《关于进一步规范生产建设项目水土保持设施验收程序的函》（水保监便字<2015>第 15 函）执行。

（六）验收的重点：水土保持设施总体布局与防治分区是否科学合理、各项防治措施是否按设计实施以及水土流失措施的数量和质量，质量验收中应包括林草成活率、保存率，工程措施经汛期暴雨的考验情况等内容。水土保持设施验收合格后，主体工程方可正式投产使用，验收不合格，主体工程不得投入生产或继续运行。

（七）严格验收标准：生产建设单位自主验收水土保持设施，要严格执行水土保持标准、规范、规程确定的验收标准和条件，确保人为水土流失得到有效防治。

（八）编制水土保持方案报告表的生产建设项目，不需要编制水土保持设施验收报告。生产建设单位组织开展水土保持设施竣工验收时，验收组中应当有至少一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家参加并签署意见，形成的水土保持设施验收鉴定书应当明确水土保持设施验收合格与否的结论。

8.6.2 工程验收后的水土保持措施管理

为便于水土保持工程验收后的监督管理工作，建设单位应将水土保持方案设计资料及图表、年度施工进度、年度经费使用等技术经济指标、水土保持效益指标以及检查验收的全部文件、报告、图表等资料整理归档。

水土保持设施竣工验收后，将由建设单位负责管理、维护、建立管理养护责任制，对工程出现的局部问题进行修复、加固，林草措施及时进行抚育、补植、更新，使其水土保持功能不断增强、稳定、长期地发挥作用。

附 表

单价计算表 1

表土剥离					
定额编号	01146	定额单位	100m ²		
工作内容：推平					
序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接工程费				93.37
（一）	基本直接费				86.46
1	人工费				5.25
	人工	工时	0.7	7.50	5.25
2	材料费				12.56
	零星材料费	%	17.0		12.56
3	机械使用费				68.64
	推土机 74KW	台时	0.49	140.09	68.64
（二）	其他直接费	%	3		2.59
（三）	现场经费	%	5		4.32
二	间接费	%	5.5		5.14
三	企业利润	%	7		6.90
四	税金	%	9		9.49
	合计				114.89
表土回覆					
定额编号	01154	定额单位	100m ³ 自然方		
工作内容：挖土、装车、运卸、空回					
序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接工程费				58.80
（一）	直接费				4713.01
1	人工费				31.50
	人工	工时	4.2	7.50	31.50
2	材料费				3.47
	零星材料费	%	11.0		3.47
3	机械使用费				439.88
	推土机 74KW	台时	3.14	140.09	439.88
（二）	其他直接费	%	3		18.80
（三）	现场经费	%	5		23.74
二	间接费	%	5.5		28.21
三	企业利润	%	7		37.87
四	税金	%	9		52.10
	合计				631.02

单价计算表 2

绿化乔木带土球栽植 (90×50cm)					
定额依据：八-19 08117				定额单位：100 株	
编号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
①	②	③	④	⑤	⑥
一	直接费				1473.40
	(一) 基本直接费				1390.00
	1.人工费	工时	180	7.50	1350.00
	2.材料费				40.00
	苗木费	株	102		0.0
	水费	m ³	8	5.0	40.0
	(二) 其他直接费	%	2		27.80
	(三) 现场经费	%	4		55.60
二	间接费	%	3.3		48.62
三	企业利润	%	5		76.10
四	税金	%	9		143.83
合 计					1741.95
绿化乔木带土球栽植 (50×50cm)					
定额依据：八-19 08116				定额单位：100 株	
编号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
①	②	③	④	⑤	⑥
一	直接费				747.30
	(一) 基本直接费				705.00
	1.人工费	工时	90	7.50	675.00
	2.材料费				30.0
	苗木费	株	102		0.0
	水费	m ³	6	5.0	30.0
	(二) 其他直接费	%	2		14.10
	(三) 现场经费	%	4		28.20
二	间接费	%	3.3		24.66
三	企业利润	%	5		38.60
四	税金	%	9		72.95
合 计					883.51

单价计算表 3

人工装、机动翻斗车运土					
定额依据：一-17 01132/01133 (I~II类土)				定额单位：100m ³ 自然方	
编号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
①	②	③	④	⑤	⑥
一	直接费				2313.69
	(一) 基本直接费				2162.33
	1.人工费	工时	103.1	7.50	773.25
	2.材料费				42.40
	零星材料费		2%		42.40
	3.机械费				1346.68
	机动翻斗车 (0.5m ³)	台时	56.67	23.76	1346.68
	(二) 其他直接费	%	3		64.87
	(三) 现场经费	%	4		86.49
二	间接费	%	4		92.55
三	企业利润	%	7		161.96
四	税金	%	9		222.81
合 计					2791.00
编织袋土填筑、拆除					
定额编号：三-15 03053/03054				100m ³ 堰体方	
编号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费				15591.53
	(一) 基本直接费				14436.60
	1.人工费	工时	1330	7.50	9975.00
	2.材料费				4461.60
	编织袋	个	3300	1.30	490.00
	其他材料费	%	4		171.60
	(二) 其他直接费	%	3		432.33
	(三) 现场经费	%	5		721.83
二	间接费	%	5.5		857.53
三	企业利润	%	7		1151.43
四	税金	%	9		1584.04
合 计					19184.54

单价计算表 4

铺塑料薄膜					
定额编号：三-4 03005				定额单位：100m ²	
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
①	②	③	④	⑤	⑥
一	直接费				117.98
	（一）基本直接费				109.24
	1.人工费	工时	10	7.50	75.00
	2.材料费				34.24
	塑料薄膜	m ²	113	0.30	33.90
	其他材料费	%	1		0.29
	（二）其他直接费	%	3		3.28
	（三）现场经费	%	5		5.46
二	间接费	%	5.5		6.49
三	企业利润	%	7		8.71
四	税金	%	9		11.99
	合 计				145.17
密目网苫盖					
定额编号：三-2 03003				定额单位：100m ²	
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
①	②	③	④	⑤	⑥
一	直接工程费				424.28
	（一）直接费				392.85
	1.人工费	工时	16	7.50	120.00
	2.材料费				272.85
	密目网	m ²	107	2.50	267.50
	其他材料费	%	2		5.35
	（二）其他直接费	%	3		11.79
	（三）现场经费	%	5		19.64
二	间接费	%	4.4		18.67
三	企业利润	%	7		31.01
四	税金	%	9		42.66
	合 计				516.61

单价计算表 5

抚育管护（第一年）					
定额依据：八-23 08136				hm ² /年	
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
①	②	③	④	⑤	⑥
一	直接工程费				1632.96
	（一）直接费				1512.00
	1.人工费	工时	144	7.50	1080.00
	2.材料费				432.00
	零星材料费	%	40		432.00
	（二）其他直接费	%	3		45.36
	（三）现场经费	%	5		75.60
二	间接费	%	3.3		53.89
三	企业利润	%	7		118.08
四	税金	%	9		162.44
合 计					1967.37
抚育管理(第二年)					
定额依据：八-23 08137				定额单位：/hm ² /年	
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
①	②	③	④	⑤	⑥
一	直接费				1174.86
	（一）基本直接费				1098.00
	1.人工费	工时	122.0	7.50	915.00
	2.材料费				183.00
	零星材料费	%	20		183.00
	（二）其他直接费	%	3		32.94
	（三）现场经费	%	4		43.92
二	间接费	%	3.3		38.77
三	企业利润	%	7		813.01
四	税金	%	9		116.87
合 计					1415.46

单价计算表 6

人工挖截（排）水沟					
定额编号	01006		定额单位	100m³自然方	
工作内容：挂线、使用铁稿开挖。					
序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费				981.14
（一）	基本直接费				908.46
1	人工费	工时	117.6	7.50	882.00
2	材料费				26.46
	零星材料费		3%		26.46
3	机械使用费				0.00
（二）	其他直接费	元	3%		27.25
（三）	现场经费	元	5%		45.42
二	间接费	元	5.5%		53.96
三	企业利润	元	7%		72.46
四	税金	元	9%		99.68
合计		元			1207.24
洒水降尘					
定额编号	P3055	定额单位		100m³	
序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费				1025.25
（一）	基本直接费				949.3
1	人工费	工时	13.0	7.5	97.5
2	材料费				510.00
	水	m³	102	5.00	510.00
3	机械使用费				341.80
	洒水车	工时	10.0	34.18	341.80
（二）	其他直接费	%	3		28.48
（三）	现场经费	%	5		47.47
二	间接费	%	5		51.26
三	企业利润	%	7		75.36
四	税金	%	9		103.67
合计					1255.54

单价计算表 7

灌木栽植					
定额依据	08092		定额单位	100 株	
编号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费				91.16
(一)	直接费				86.0
1	人工费	工时	11	7.50	82.50
2	材料费				3.5
	花苗	株	102	0	
	水费	m ³	0.7	5.0	3.5
(二)	其他直接费	元	2%		1.72
(三)	现场经费	元	4%		3.44
二	间接费	元	3.3%		3.01
三	企业利润	元	5%		4.71
四	税金	元	9%		8.90
合 计					107.78
撒播种草 (黑麦草)					
定额依据	08057		定额单位	hm ²	
编号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	直接费				517.19
(一)	直接费				487.91
1	人工费	工时	60	7.50	450.00
2	材料费				37.91
	种子	kg	30	25.3	758.25
	其他材料费		5%		37.91
(二)	其他直接费	元	2%		9.76
(三)	现场经费	元	4%		19.52
二	间接费	元	3.3%		17.07
三	企业利润	元	5%		26.71
四	税金	元	9%		50.49
合 计					611.45

附件

委 托 书

庆阳市金美森环境工程有限公司：

根据《中华人民共和国水土保持法》等法律法规，现将
本单位 宁县平子镇聚星苑小区 项目水土
保持方案编制工作委托你公司办理，具体要求如下：

- 1、 编制的水土保持方案必须符合《中华人民共和国水土保持法》等法律法规；
- 2、 方案编制须依据《生产建设项目水土保持技术标准》
(GB50433-2018) 进行科学合理的编制；
- 3、 方案设计合理、措施完善，能够有效的防治水土流
失和改善生态环境；

望贵单位接此委托书后，及时组织设计人员开展工作，
如期完成此项工作。


委托单位：

法定代表人：

或其委托代理人签字：



2022 年 7 月 5 日



甘肃省投资项目备案证

备案号：庆阳市宁县发改局投资股备[2021]101号

项目名称：	宁县平子镇聚星苑小区项目	项目法人单位：	庆阳聚星苑房地产开发有限公司
项目代码：	2105-621026-04-01-463569	法人单位经济类型：	企业法人
建设地点：	平子镇平子村	统一社会信用代码：	91621002MA72W3D9E
建设性质：	新建	法定代表人：	刘小勇
计划建设时间：	2021年5月-2024年5月	项目负责人及电话：	133-6939
项目总投资：	8000万	产业投向：	房地产开发、销售；房地产经纪；物业管理；建筑材料销售；房屋租

建设规模及内容：项目总用地9.94亩，总建筑面积23874.87平方米，拟建15层剪力墙结构住宅楼1栋，地下车库3460平方米，便利店60.56平方米，物业用房60.56平方米，车位158个。


项目法人单位承诺：项目信息真实、完整、准确，符合法律法规符合国家和甘肃省相关产业政策，如有违法违规情况愿承担相关法律责任
同登备案



材料的真实性请按照<http://tzm.gsxw.gov.cn>网站查询，备案机关电话：6622426

甘(2021) 宁县 不动产权第 0002631 号

权 利 人	庆阳聚星苑房地产开发有限公司
共有情况	单独所有
坐 落	宁县平子镇平子街道
不动产单元号	621026101209GB00067W000000000
权利类型	国有建设用地使用权
权利性质	出让
用 途	城镇住宅用地
面 积	6624.10m ²
使用期限	国有建设用地使用权 2021-04-01 起 2091-03-31止
权利其他状况	



宗地图


单位: m.²

宗地代码: 621026101209GB00067

土地权利人: 庆阳聚星苑房地产开发有限公司

所在图幅号: 3924.40-36515.75

宗地面积: 6624.10

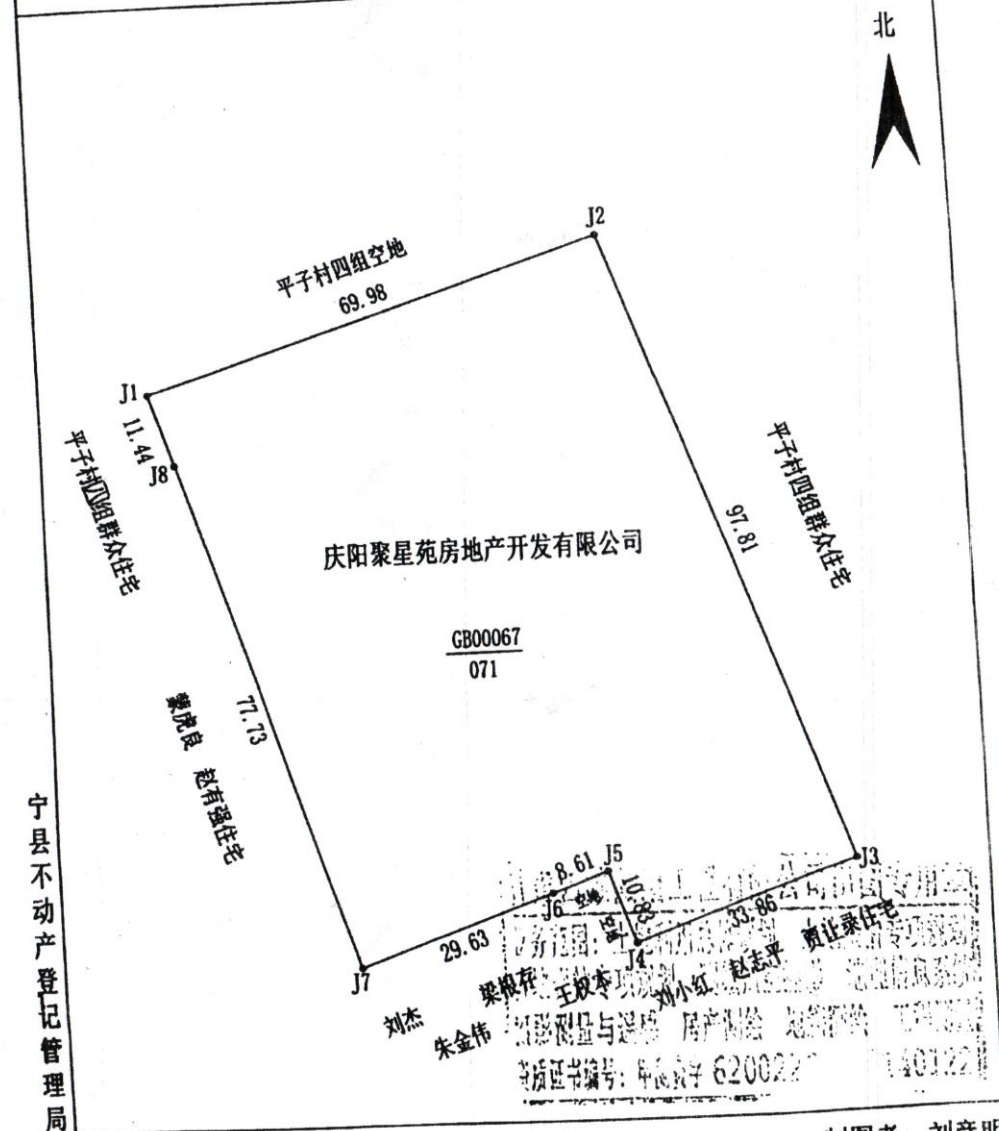

2021年04月解析法测绘界址点
制图日期: 2021年4月6日
审核日期: 2021年4月6日

1:200

制图者: 刘彦明
审核者:

附 图
