宁 县 民 政 局

宁县殡仪馆建设项目支出绩效自评报告

根据财政预算绩效管理相关规定及工作要求，我单位对2025年度甘财建〔2025〕71号宁县殡仪馆建设资金项目开展绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目单位基本情况

（一）单位基本情况

宁县民政局是县政府主管民政事务的行政职能部门，主要承担社会救助、殡葬管理、养老服务、基层政权建设、社会组织监管等民生保障与社会服务职能，负责推进全县殡葬基础设施规划、建设与管理，补齐公共服务短板，提升基本社会服务水平。

（二）项目基本情况

项目名称：甘财建〔2025〕71号宁县殡仪馆建设资金

主管单位：宁县民政局

实施单位：甘肃省宁县民政局

项目建设内容：按照甘肃省“十四五”殡葬补短板规划要求，新建宁县殡仪馆1处，完善殡葬基础设施，提升全县殡葬公共服务能力。

项目资金构成及来源：项目年度资金总额1532万元，全部为财政拨款，无上年结转资金及其他资金。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

我单位成立项目专项工作小组，建立项目建设管理制度、资金使用管理制度、工程质量监管制度，明确责任分工与建设时序。项目按程序推进前期手续、工程建设与质量管控，全程开展进度跟踪与现场监督，及时纠偏整改，确保工程建设规范、质量达标。

（二）项目资金使用情况

2025年度甘财建〔2025〕71号宁县殡仪馆建设资金项目支出预算安排0元，下达指标1532万元，实际支付700万元，预算执行率45.69%。资金实行专款专用、专户管理、专项核算，严格执行工程进度付款、国库集中支付等规定，确保资金使用合规、安全、高效。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

本次自评严格依据设定的绩效指标体系，通过查阅项目资料、核对资金支付凭证、现场核验工程建设情况、核查验收资料、统计服务对象满意度等方式开展全面评价。经综合评定，项目自评得分91.24分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

预算执行方面：全年预算数1532万元，全年执行数700万元，执行率45.69%，该项得分4.56分。

成本指标方面：成本控制数≤1532 万元，实际支出 700 万元，成本控制合规，该项得分 20 分。

产出指标方面：建成殡仪馆 1 处，完成数量目标；项目验收合格率 100%，质量达标；项目建设及时推进，时效达标，合计得分 38.67 分。

效益指标方面：有效完善全县殡葬基础设施，社会效益显著，该项得分 18 分。

满意度指标方面：受益对象满意度达 92%，完成≥92%的目标要求，该项得分 10 分。

四、存在问题

预算执行进度偏慢，资金支付效率不高项目预算执行率仅 45.69%，未达到高效支出要求。主要原因是工程建设前期手续办理周期较长、工程进度与资金支付衔接不够紧密，部分环节审核流程偏多，导致资金拨付滞后，财政资金使用效率未能充分发挥，影响项目整体推进节奏。

项目绩效目标动态监控不足项目实施过程中，侧重工程建设与质量监管，对绩效目标的动态跟踪、实时监控不够到位，缺乏常态化绩效运行监控机制。部分指标完成情况未能及时统计、分析与预警，绩效监控的及时性、精准性有待提升，不利于及时发现并解决实施中的问题。

项目过程管理资料规范化程度有待提升项目建设涉及前期手续、招投标、工程监理、质量验收、资金支付等多类资料，部分资料整理不够系统、归档不够及时，存在资料分

散、要素不全等情况。全过程管理痕迹留存不够完整规范，不利于项目复盘、绩效评价与后续审计核查。

项目实施与长效运营衔接不够充分项目建设阶段重点聚焦工程完工与验收，对殡仪馆建成后的运营管理、人员配置、服务流程、长效维护等前期谋划不足，建设与运营衔接机制不够健全，可能影响项目投用后服务效能持续稳定发挥。

五、有关建议

加快预算执行进度，提升资金使用效率。优化工程进度与资金支付衔接机制，简化内部审核流程，提高付款审批效率；建立项目支出进度台账，按月调度、按期推进，避免“钱等项目、进度滞后”；加强与施工、监理等单位协同，按合同约定及时足额支付工程款，切实提高预算执行率与财政资金使用效益。

健全绩效目标动态监控机制。建立项目绩效运行常态化监控体系，按季度开展绩效指标完成情况跟踪、统计与分析，对执行偏差及时预警、限期整改；将绩效监控嵌入项目实施全过程，实现“目标—执行—监控—整改”闭环管理，提升绩效目标管控精准性与时效性。

规范项目全过程资料管理。制定项目资料标准化归档清单，明确前期手续、招投标、工程建设、质量监管、资金使用、验收评价等资料收集范围、整理标准与归档时限；指定专人负责资料管理，定期梳理、分类归档、系统保管，确保

项目全过程资料完整、规范、可查，满足绩效评价与监督管理需要。

强化项目建设与长效运营衔接。提前谋划殡仪馆运营管理方案，同步完善人员配置、服务规范、安全管理、设施维护等制度；加强运营管理人员培训，提升殡葬服务专业化水平；建立项目建设与运营联动机制，确保项目建成即投用、投用即规范，持续发挥殡葬公共服务社会效益。

加强项目全周期管理能力建设。组织开展项目管理、预算绩效、财务规范、工程监管等专题培训，提升工作人员业务能力；完善项目管理制度体系，强化责任落实与监督考核，推动项目管理规范化、精细化、高效化，保障殡葬项目高质量建设、可持续运营。

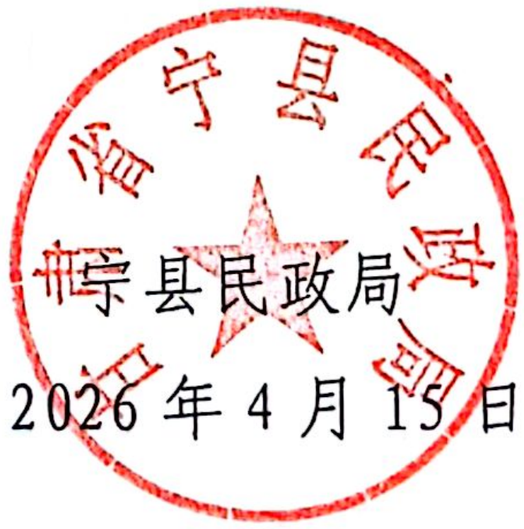

宁县民政局

2026年4月15日

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	甘财建[2025]71号宁县殡仪馆建设资金						
主管部门	宁县民政局			实施单位	甘肃省宁县民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	15320000	7000000	10	45.69	4.56
	其中：财政拨款		15320000	7000000	-	45.69	4.56
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补齐甘肃省十四五规划殡葬补短板，完善我县殡葬基础设施。			按年初目标完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=1532万元	700	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	建成殡仪馆数量	=1处	1	13.33	处	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时效	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	殡葬基础设施	完善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=92%	92	10	%	100.00%	10	
总分						100			91.24	
